



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Odkanalizování obcí v povodí Jizery, část C

Identifikační číslo projektu: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007096

SMLOUVA O DÍLO č. VRI/SOD/2020/13/Ži DODATEK Č. 3

č. objednatele VRI/SOD/2020/13/Ži/D3

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.

Se sídlem: Čechova 1151, Mladá Boleslav, 293 22

IČO: 463 56 983 DIČ : CZ46356983

bankovní spojení: č.ú.: 1608 181/0100 vedený u KB Mladá Boleslav:

jednající ve věcech smluvních: Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

jednající ve věcech technických: Ing. Tomáš Žitný - technický náměstek

Ing. Miloš Kafluk, vedoucí oddělení VRI

Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2379, sp.zn.Firm.40987/93

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Sdružení Odkanalizování obcí v povodí Jizery, část C

Zastoupená Společníkem č. 1: „Ještědská stavební společnost spol. s r.o.“, Liberec XII – Staré Pavlovice, Selská 517, PSČ 460 01

se sídlem: Selská 517, Liberec XII – Staré Pavlovice, PSČ: 460 01

IČO: 18382550 DIČ: CZ18382550

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, v oddíle C, vložce 363

bankovní spojení: č. ú.: 123-1509950257/0100 vedený u KB Liberec

jednající ve věcech smluvních: Josef Kubeš, Ing. Petr Janda, Ing. Martin Matzner, za společnost jednájí společně

vždy alespoň dva jednatelé

jednající ve věcech technických: Ing. Martin Matzner

„Společník“: Společník č. 2: POHL cz, a.s., Roztoky, Nádražní 25, PSČ 252 63

na straně druhé jako Zhotovitel (dále jen „Zhotovitel“)

**Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 3 smlouvy o dílo č.
VRI/SOD/2020/13/Ži**



0. Úvod

Zhotovitel díla dne 6.4.2022 oznámil Objednateli „Překážku vyšší moci“, ve kterém se odvolává na probíhající válečný konflikt na Ukrajině (příloha č. 8) a upozorňuje Objednatele, že tato překážka mu brání v plnění jeho závazků vyplývajících z uzavřené Smlouvy a to zejména v oblasti časové a finanční. Zhotovitel požádal Objednatele o součinnost. Zhotovitel vyvíjel maximální snahu o to, aby nedocházelo k zastavení prací z důvodu omezení jeho kapacit. Vzhledem ke vzniku této překážky nebyl zhotovitel schopen stanovit nový termín dokončení celého díla a z toho důvodu se smluvní strany dohodly, že budou vyvíjet maximální součinnost k tomu, aby dílo bylo dokončeno co nejdříve, jak to vnější podmínky dovolí a že konečný termín dokončení bude stanoven, jakmile bude většina prací dokončena a zhotovitel bude schopen termín garantovat. Současná rozpracovanost při plnění díla je následující:

- Ucelená etapa 10) **Horní Stakory, výstavba kanalizace** byla Zhotovitelem dokončena, dne 1.12. 2021 bylo zahájeno přejímací řízení, které bylo ukončeno 15.12.2021. Objednatel s doklady předanými Zhotovitelem požádal o kolaudaci dokončené stavby a dne 7.3.2022 vydal kolaudátor kolaudační souhlas.
- Ucelená etapa 2) **Hrdlořezy, výstavba kanalizace** byla Zhotovitelem dokončena, dne 12.5.2022 bylo zahájeno přejímací řízení, které bylo ukončeno 15.5.2022. Objednatel s doklady předanými Zhotovitelem požádal o kolaudaci dokončené stavby a dne 12.7.2022 proběhlo místní šetření kolaudátora a následně byl 18.7.2022 vydán kolaudační souhlas.
- Ucelená etapa 6) **Malá Bělá, výstavba kanalizace**, zhotovitel požádal objednatel o zahájení přejímacího řízení dne 14.4.2022, ale vzhledem k tomu, že ve spolupráci s Městem Bakov nad Jizerou probíhají opravy místních komunikací po stavbě kanalizace ve větším rozsahu, nežli uvažoval projekt, nebylo zatím přejímací řízení ukončeno.

Zhotovitel díla dne 23.6.2022 oznámil objednateli překážku vyšší moci, ve kterém se odvolává na oznámení z 6.4.2022 a žádá o změnu ceny díla za práce a dodávky realizované v roce 2022 a dokládá nepředvídatelný nárůst cen nákladů potvrzením hodnoty indexů růstu cen ÚRS CZ. a.s. (příloha č. 9).

Na základě současného stavu při realizaci projektu se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku smlouvy o dílo č. 3, který stanovuje konečný termín realizace díla, konečnou smluvní cenu díla a který mění či doplňuje uzavřenou smlouvu o dílo č. VRI/SOD/2020/13/Ži a uzavřené dodatky č.1 a č.2 a v následujících ustanoveních:

1. Předmět smlouvy

- 1.1. U ucelené etapy 6) **Malá Bělá, výstavba kanalizace** nebyl v projektové dokumentaci dostatečně technicky řešený příjezd u SO 05 k ČSOV 1 přes místní vodoteč, v dokumentaci chyběla vjezdová vrata, zabezpečení proti pádu z mostku a nebylo dořešené technické řešení vozovky na mostku. Na základě žádosti Objednatele projektant stavby zpracoval doplnění dokumentace, na základě které Zhotovitel zpracoval návrh změny s rozdílovou kalkulací. Předmět změny je podrobněji popsán ve **Změně č. 11**, která jako příloha č. 1 je nedílnou součástí dodatku smlouvy o dílo č. 3.
- 1.2. U ucelené etapy 10) **Horní Stakory, výstavba kanalizace** byly stavební práce dokončeny a na základě geodetického zaměření skutečně provedených prací zpracoval Zhotovitel doměrkový rozpočet ve formě Změny č. 12. Předmět změny je podrobněji popsán ve **Změně č. 12**, která jako příloha č. 2 je nedílnou součástí dodatku smlouvy o dílo č. 3.
- 1.3. U ucelené etapy 2) **Hrdlořezy, výstavba kanalizace** byly stavební práce dokončeny a na základě geodetického zaměření skutečně provedených prací zpracoval Zhotovitel doměrkový rozpočet ve formě Změny č. 13. Předmět změny je podrobněji popsán ve **Změně č. 13**, která jako příloha č. 3 je nedílnou součástí dodatku smlouvy o dílo č. 3.
- 1.4. U ucelené etapy 6) **Malá Bělá, výstavba kanalizace** byly stavební práce dokončeny a na základě geodetického zaměření skutečně provedených prací zpracoval Zhotovitel doměrkový rozpočet ve formě Změny č. 14. Předmět změny je podrobněji popsán ve **Změně č. 14**, která jako příloha č. 4 je nedílnou součástí dodatku smlouvy o dílo č. 3.
- 1.5. U ucelené etapy 2) **Hrdlořezy, výstavba kanalizace** u některých místních komunikací ve správě obce nacházejících se ve spodní části obce, obec požádala o provedení jiné skladby konstrukčního souvrství ve výkopových rýhách (studená recyklace), ale při dodržení stejných technických parametrů (únosnost,



životnost), protože by chtěla opravit při příležitosti výstavby kanalizace některé místní komunikace celoplošně (i mimo výkopové rýhy) touto technologií studené recyklace. Tato technologie je pro obec výhodnější než klasické odtěžení vrstev komunikace, odvezení na skládku a uložení nových šterkových vrstev. Objednatel chce požadavku obce vyhovět s tím, že práce provedené na opravách komunikací nad rámec projektu stavby kanalizace obci přeúčtuje. Předmět změny je podrobněji popsán ve **Změně č. 15**, která jako příloha č. 5 je nedílnou součástí dodatku smlouvy o dílo č. 3.

- 1.6. U ucelené etapy **6) Malá Bělá, výstavba kanalizace** u některých místních komunikací ve správě obce, obec požádala o provedení jiné skladby konstrukčního souvrství ve výkopových rýhách (studená recyklace), ale při dodržení stejných technických parametrů (únosnost, životnost), protože by chtěla opravit při příležitosti výstavby kanalizace některé místní komunikace celoplošně (i mimo výkopové rýhy) touto technologií studené recyklace. Tato technologie je pro obec výhodnější než klasické odtěžení vrstev komunikace, odvezení na skládku a uložení nových šterkových vrstev. Objednatel chce požadavku obce vyhovět s tím, že práce provedené na opravách komunikací nad rámec projektu stavby kanalizace obci přeúčtuje. Předmět změny je podrobněji popsán ve **Změně č. 16**, která jako příloha č. 6 je nedílnou součástí dodatku smlouvy o dílo č. 3.

2. Specifikace díla

- 2.1. Změnou č. 11 dochází ke doplnění technického řešení příjezdu k SO 05 ČSOV 1 přes místní vodoteč. Doplněny byla vjezdová vrata na základě požadavku majitele sousedního pozemku, svodidla a zábradlí na mostku a také technické řešení vozovky na mostku. Přesná specifikace a rozsah jsou uvedeny ve změnovém listu a jeho přílohách.
- 2.2. Změnami č. 12, 13 a 14 (doměrkové změnové listy) dochází k podrobnému vyúčtování skutečně provedených prací na základě geodetického zaměření geodetem stavby. Přesné délky provedených částí díla (kanalizace, výtlaky, přípojky) jsou uvedené v předávacích protokolech jednotlivých ucelených etap díla a ve změnových listech a jejich přílohách.
- 2.3. Změnou č. 15 dochází na základě požadavku obce Hrdlořezy ke zvětšení rozsahu oprav místních komunikací mimo výkopovou rýhu a ke změně technologie opravy komunikace. Přesná specifikace a rozsah jsou uvedeny ve změnovém listu a jeho přílohách.
- 2.4. Změnou č. 16 dochází na základě požadavku obce Malá Bělá (místní část města Bakov nad Jizerou) ke zvětšení rozsahu oprav místních komunikací mimo výkopovou rýhu a ke změně technologie opravy komunikace. Přesná specifikace a rozsah jsou uvedeny ve změnovém listu a jeho přílohách.
- 2.5. Změnou č. 17 dochází k úpravě ceny stavebních prací a dodávek provedených v roce 2022. Změnový list č. 17 je přílohou č. 7.

3. Doba plnění

- 3.1. Zhotovitel díla dne 6.4.2022 oznámil Objednateli „Překážku vyšší moci“, ve kterém se odvolává na probíhající válečný konflikt na Ukrajině a upozorňuje Objednatele, že tato překážka mu brání v plnění jeho závazků vyplývajících z uzavřené Smlouvy a to zejména v oblasti časové. Vzhledem ke vzniku této překážky nebyl zhotovitel schopen stanovit konečný termín dokončení celého díla a z toho důvodu se smluvní strany dohodly, že budou vyvíjet maximální součinnost k tomu, aby dílo bylo dokončeno co nejdříve jak to vnější podmínky dovolí a že konečný termín dokončení bude stanoven, jakmile bude většina prací dokončena a zhotovitel bude schopen termín garantovat. Vzhledem k tomu, že ucelené etapy **10) Horní Stakory, výstavba kanalizace** a **2) Hrdlořezy, výstavba kanalizace** byly zcela dokončeny a byly objednatelům převzaty a práce jsou dokončovány jen u ucelené etapy **6) Malá Bělá, výstavba kanalizace** a Zhotovitel požádal objednatele o zahájení přejímacího řízení, dohodly se smluvní strany na konečném termínu dokončení díla do **15.8.2022**. Zhotovitel prohlašuje, že tento termín je konečný a že je schopen i přes válečný stav v Evropě v tomto termínu dílo řádně dokončit a předat Objednateli.



5. Cena za dílo, platební podmínky

5.1. Smluvní strany se dohodly na změně výše ceny za dílo:

SOD	Číslo změnového listu	Etapa stavby	Stručný popis změny	Cena změny	Vypořádání z hlediska ZZVZ
Dodatek SOD č. 3	Změnový list č. 11	6) Malá Bělá	Příjezdové komunikace, mostek	420 445,45	§ 222, odst. 4
	Změnový list č. 12 - doměrkový rozpočet Horní Stakory	10) Horní Stakory	doměrkový rozpočet, nezpůsobilé náklady	206 327,97	§ 222, odst. 4
		10) Horní Stakory	doměrkový rozpočet, způsobilé náklady	-299 816,60	§ 222, odst. 4
				-93 488,63	
	Změnový list č. 13 - doměrkový rozpočet Hrdlořezy	2) Hrdlořezy	doměrkový rozpočet, nezpůsobilé náklady	-498 105,71	§ 222, odst. 4
		2) Hrdlořezy	doměrkový rozpočet, způsobilé náklady	247 920,55	§ 222, odst. 4
				-250 185,16	
	Změnový list č. 14 - doměrkový rozpočet Malá Bělá	6) Malá Bělá	doměrkový rozpočet, nezpůsobilé náklady	224 709,87	§ 222, odst. 4
		6) Malá Bělá	doměrkový rozpočet, způsobilé náklady	2 193 328,54	§ 222, odst. 4
				2 418 038,41	
Změnový list č. 15	2) Hrdlořezy	Hrdlořezy, místní komunikace obec	3 122 775,14	§ 222, odst. 5	
Změnový list č. 16	6) Malá Bělá	Malá Bělá, místní komunikace obec	979 153,30	§ 222, odst. 5	
Změnový list č. 17	Celá etapa	Inflační navýšení prací v roce 2022	3 526 110,27	§ 222, odst. 4	
	Celkem dod č. 3		10 122 848,77		
	Cena díla po uzavření dodatku č. 3		304 991 374,17		

Název ucelené etapy	Cena dle SOD (Kč bez DPH)	Cena dle dodatku SOD č. 1 (Kč bez DPH)	Cena dle dodatku SOD č. 2 (Kč bez DPH)	Změna ceny v dodatku SOD č. 3 (Kč bez DPH)	Cena dle dodatku SOD č. 3 (Kč bez DPH)	Cena dle dodatku SOD č. 3 (Kč bez DPH)
Hrdlořezy, výstavba kanalizace	116 048 667,80	116 048 667,80	116 963 538,93	5 078 491,34	122 042 030,27	147 670 856,62
Malá Bělá, výstavba kanalizace	82 036 688,20	92 828 927,58	89 038 123,51	5 137 846,07	94 175 969,58	113 952 923,19
Horní Stakory, výstavba kanalizace	88 942 717,50	88 942 717,50	88 866 862,97	- 93 488,63	88 773 374,34	107 415 782,95
JIZERA ČÁST C	287 028 073,50	297 820 312,88	294 868 525,41	10 122 848,77	304 991 374,18	369 039 562,76

Celková nová cena za celé dílo bez DPH **304 991 374,18 Kč**
(slovy: tři sta čtyřmilióny devět set devadesát jedentisíc třístasedmdesát čtyřikorun osmnáct haléřů)
Výše DPH **64 048 188,58 Kč**
(slovy: šedesát čtyřmiliónů čtyřicet osmtisíc sto osmdesát osmkorun padesát osm haléřů)
Celková nová cena za dílo včetně DPH **369 039 562,76 Kč**
(slovy: tři sta šedesát devět milionů třicet devět tisíc pět set šedesát dvě koruny sedmdesát šest haléřů),
dále též „Cena za provedení díla“)

5.2. Cena za provedení díla je tvořena dílčími cenami za provedení ucelených etap stavby, a to následovně:
Cena za provedení etapy 2) Hrdlořezy, výstavba kanalizace bez DPH 122 042 030,27 Kč
Cena za provedení etapy 6) Malá Bělá, výstavba kanalizace bez DPH 94 175 969,58 Kč
Cena za provedení etapy 10) Horní Stakory, výstavba kanalizace bez DPH 88 773 374,34 Kč

5.7. V případě, že byly všechny vady odstraněny až na dokumentaci skutečného provedení a geometrické plány, uvolní objednatel 90% pozastávek.

14. Předání a převzetí díla

14.10 V případě, že Objednatel převezme dílo s drobnými vadami či nedodělky, sjednaly smluvní strany, že je Zhotovitel odstraní nejpozději do 15 dnů od předání a převzetí díla, pro geometrické plány a dokumentaci skutečného provedení stavby se tato lhůta prodlužuje na 90 dnů.



20. Společná ustanovení

- 20.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. VRI/SOD/2020/13/Ži vč. dodatků č. 1 a č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 20.1.1. Z hlediska č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ) jsou změny řešeny v souladu s § 222 odst. (4) a odst. (5).
- 20.1.2. V průběhu realizace díla byly zjišťovány okolnosti, které si vyžádaly drobné změny projektovaného technického řešení díla a které nemohl projektant zcela přesně při zpracování projektu předpokládat. Z toho důvodu byly řešeny se Zhotovitelem jednotlivé změny ve smyslu §222 odst. (4), jednalo se o změnové listy č. 2,3,5,7,8,9,10,11,12,13,14 a 17. Tyto drobné změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich celková hodnota (35 869 105,35 Kč bez DPH) nepřesáhla 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy (43 054 211,03 Kč bez DPH).
- 20.1.3. Objednatel v průběhu realizace díla zjistil, že některé stávající vodovodní řady, které jsou vedeny souběžně s trasami nově budované kanalizace a které jsou v provozování a ve vlastnictví Objednatele, nejsou ve vyhovujícím technickém stavu a rozhodl se, že bude nejvhodnějším řešením před provedením opravy komunikace po stavbě kanalizace, provést jejich obnovu. Provedení obnovy vodovodu v následujících letech by Objednateli způsobilo zvýšení nákladů na opravu komunikací a nadměrně by obtěžovalo obyvatele obce. Tyto dodatečné stavební práce nebyly zahrnuty v původním závazku, byly řešeny změnovým listem č. 1 v rozsahu 10 763 674,08 Kč (bez DPH). Z hlediska ZZVZ se jedná o změnu podle §222 odst. (5). Obdobně na základě žádosti obcí, ve kterých se jednotlivé ucelené etapy díla realizovaly, byly realizovány dodatečné stavební práce týkající se celoplošných oprav místních komunikací. Obce s Objednatelem na realizaci díla aktivně spolupracují a provedení většího rozsahu oprav komunikací (v celé šíři komunikace a ne jen nad výkopovou rýhou po stavbě kanalizace) s jiným dodavatelem by bylo velmi problematické a nákladnější. Z toho důvodu na základě žádosti obcí požádal Objednatel Zhotovitele o provedení dodatečných stavebních prací spočívající v provedení opravy zbývajících plochy místních komunikací. Provedení těchto prací by v následujících letech obcím způsobilo zvýšení nákladů na opravu komunikací a nadměrně by obtěžovalo obyvatele obcí. Tyto dodatečné stavební práce nebyly zahrnuty v původním závazku, byly řešeny změnovými listy č. 4,6,15 a 16 v rozsahu 12 775 550,54 Kč (bez DPH). Z hlediska ZZVZ se jedná o změnu podle §222 odst. (5).

21. Závěrečná ustanovení

- 21.1 Smlouva nabývá platnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými Smlouvu uzavřít. Účinnosti nabývá Smlouva dnem uveřejnění v Registru smluv. Uveřejnění zabezpečuje Objednatel.
- 21.2 Smluvní strany konstatují, že Smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel rovněž dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
- 21.3 Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného Smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.
- 21.4 Nedílnou součástí dodatku č. 2 Smlouvy tvoří jako přílohy:
- Příloha č. 1** Změnový list č. 11 včetně cenové rekapitulace
 - Příloha č. 2** Změnový list č. 12 včetně cenové rekapitulace
 - Příloha č. 3** Změnový list č. 13 včetně cenové rekapitulace
 - Příloha č. 4** Změnový list č. 14 včetně cenové rekapitulace
 - Příloha č. 5** Změnový list č. 15 včetně cenové rekapitulace
 - Příloha č. 6** Změnový list č. 16 včetně cenové rekapitulace
 - Příloha č. 7** Změnový list č. 17 včetně cenové rekapitulace
 - Příloha č. 8** Oznamení zhotovitele o výskytu okolností vyšší moci z 6.4.2022



Příloha č. 9 Hodnota indexů meziročního nárůstu cen ÚRS CZ a.s. č.j. 4D/2022/003 z 8.6.2022, Ing. arch. Karel Březina, vedoucí informační služby ÚRS CZ a.s.

Příloha č. 10 Rekapitulace konečné celkové ceny díla

3.2. Součástí této smlouvy jsou rovněž volně oddělitelné (se smlouvou nespojené) přílohy:

- Příloha č. 1** Položkové rozpočty Zhotovitele pro změnu č. 11
- Příloha č. 2** Položkové rozpočty Zhotovitele pro změnu č. 12
- Příloha č. 3** Položkové rozpočty Zhotovitele pro změnu č. 13
- Příloha č. 4** Položkové rozpočty Zhotovitele pro změnu č. 14
- Příloha č. 5** Položkové rozpočty Zhotovitele pro změnu č. 15
- Příloha č. 6** Položkové rozpočty Zhotovitele pro změnu č. 16
- Příloha č. 7** Položkové rozpočty Zhotovitele pro změnu č. 17

21.5 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nikoliv jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

21.6 Smluvní strany se dohodly, že adresou pro doručování bude adresa stran uvedená ve Smlouvě, ledaže smluvní strana oznámí druhé straně změnu své adresy. Smluvní strany jsou povinny zabezpečit náležitě přijímání zásilek na uvedené adrese. V případě nepřevzetí zásilky se projev vůle jedné smluvní strany adresovaný druhé smluvní straně považuje za doručení třetím dnem od uložení nepřevzaté zásilky u doručovatele. To platí i v případě, že se druhá strana se zásilkou neseznámila nebo se v místě doručení nezdržuje.

V Mladé Boleslavi dne 29.7. 2022

V Liberci dne 29.07. 2022

Ing. Vladimír Stehlík
předseda představenstva

Ing. Tomáš Žitný
člen představenstva

Josef Kubeš
jednatel

Ing. Martin Matzner
jednatel

VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 31



ZMĚNOVÝ LIST č. 011

v projektu: Odkanalizování obcí v povodí Jizery
projektu: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007096

Objednatel: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Čechova 1151 293 22 Mladá Boleslav	Změnový list číslo:	011
Zhotovitel: Sdružení Odkanalizování obcí v povodí Jizery, část C; společnost Selská 517 460 01 Liberec XII	Datum vydání:	
Správce stavby: Sdružení „Garnets – Realstav MB“ Garnets Consulting a.s. Československých legií 445/4 415 01 Teplice	Číslo smlouvy:	

**Název pod-projektu
SO/PS dotčené změnou:**

Odkanalizování obcí v povodí Jizery – část C, Malá Bělá
06) **Malá Bělá** *Uznatelné náklady* - 07 Příjezdová komunikace

Stručný popis změny:

Upřesnění řešení příjezdové komunikace a mostku k ČSOV 1

Popis změny technického řešení:

- Objednatel upřesnil a doplnil z vlastní iniciativy technické řešení příjezdu k ČSOV 1. V dokumentaci převzaté od města Bakov nad Jizerou byla tato část nedostatečně řešena. V rámci realizační dokumentace, kterou zpracoval projektant objednatele byla upřesněna konstrukce objektu mostku k ČSOV1, doplněna zábradelní svodidla, gabionové koše a byla doplněna vstupní vjezdová vrata.

Původní řešení dle smluvní (zadávací dokumentace):

- Dle zadávací PD bylo řešeno na výkresu č. F 7.1.1 a F.9.1

Nové řešení:

- Nové řešení zpracoval projektant na žádost objednatele a zpracoval 3 výkresy označené jako přílohy C.3.1.

Zdůvodnění změny:

Z hlediska ZZVZ jde o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222, odst. 4

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

- | | |
|---|--------------------------------|
| a) zadávací dokumentace | ano |
| b) realizační (dílešská) dokumentace zhotovitele: | změna bude zapracována do DSPS |
| c) výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval: | objednatel |

Předpokládaný vliv na:

- | | |
|--------------|-----|
| a) termín | ano |
| b) kvalitu | ne |
| c) cenu díla | ano |

ZMĚNOVÝ LIST č. 011

Název projektu: Odkanalizování obcí v povodí Jizery
 Číslo projektu: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007096

Náklady na změnu	Změna se bude týkat způsobilých nákladů projektu			
	Vícepráce nezpůsobilé		Méněpráce způsobilé	
	bez DPH	včetně DPH	bez DPH	včetně DPH
stavební náklady - způsobilé	515 693,78 Kč	623 989,47 Kč	-95 248,33 Kč	-115 250,48 Kč
celkem ZL č. 011 bez DPH	420 445,45 Kč			
celkem ZL č. 011 vč. DPH	508 738,99 Kč			

Změnu navrhuje:	Objednatel
------------------------	-------------------

Souhlas zhotovitele:	Zhotovitel se změnou souhlasí
-----------------------------	--------------------------------------

Datum: 29.07.2022

Jméno odpovědné osoby zhotovitele:

Ing. Martin Matzner

Podpis:

Razítko:

Ještědská stavební společnost
 s.r.o.
 Selská 517, 460 01 Liberec XII - Stará Pavlovice
 IČ: 10280300 DIČ: CZ10280300

Souhlas projektanta:	Projektant se změnou souhlasí
-----------------------------	--------------------------------------

Datum: 29.7.2022

Jméno odpovědné osoby projektanta:

Ing. Martin Butor

Podpis:

Razítko:

Vodohospodářské inženýrské služby,
 akciová společnost
 Křížová 472/47
 150 00 Praha 5

Souhlas a vyjádření správce stavby:	Správce stavby se změnou souhlasí
--	--

Datum:

Jméno odpovědné osoby správce stavby:

p. Jiří Bouma

Podpis:

③ **SPRÁVCE STAVBY**
 Sdružení „Garnets - Realstav MB“
 Garnets Consulting a.s.
 Realstav MB, spol. s r.o.
 Odkanalizování obcí v povodí Jizery
 Razítko:

ZMĚNOVÝ LIST č. 011

Název projektu: Odkanalizování obcí v povodí Jizery
Číslo projektu: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007096

Souhlas objednatele:	Objednatel se změnou souhlasí
----------------------	-------------------------------

Datum: 29.7.2022

Jméno odpovědné osoby objednatele:

Ing. Tomáš Žitný



Podpis:


Razítko:

VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 88

Přílohy změnového listu:

- 1) Položkový rozpočet
- 2) Výkresová dokumentace změny, příloha č. C.3.1 ČS1, 3 části –zpevněné plochy, ŘEZ A-A, vjezdová vrata


Poznámka:

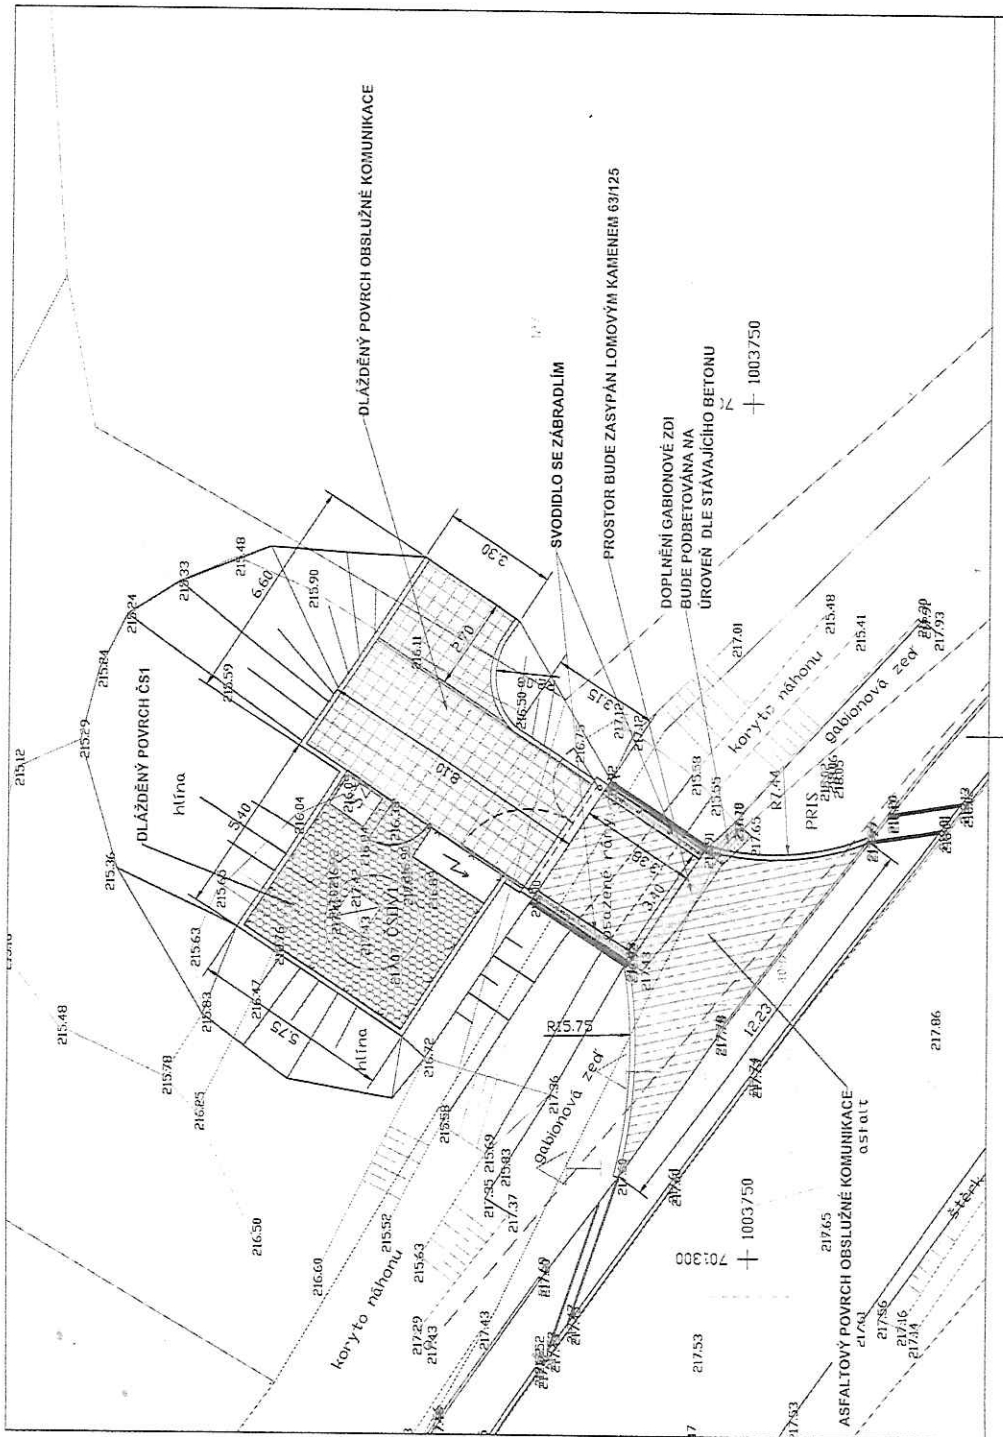

POZNÁMKA

STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ JSOU ZAKRESLENY ČAROU PRO NEOVĚŘENÝ PRUBĚH A ZAKRESLENY PRUBĚH JE POUŽÍTE PŘÍBLIŽNÝ. VŠECHY STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ JE NUTNÉ PŘED ZAČÍNÁNÍM VÝKOPOVÝCH PRÁCI NECHAT VYTÝČIT JEJICH SPRÁVCI, KTERÍ ODPOVÍDAJÍ ZA PŘESNÉ URČENÍ POLOHY.

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV

 VODOHOSPODÁŘSKÉ INŽENÝRSKÉ SLUŽBY a.s. KRŽEVOV 47, 150 39 PRAHA 5		Hlavní inž. projekt: Ing. M. Bulor
		Ved. atelieru: Ing. L. Kužel
Výpracovatel: Ing. M. Breda Projektant: Ing. M. Breda		Datum: březen 2022
DOSTAVBA KANALIZACE V MÍSTNÍ ČÁSTI MALÁ BĚLA		Stupeň: DSP
SO 05 - ČERPAČÍ STANICE ODPADNÍCH VOD		Fornát: 3 A4
Investor: VSK Malá Bělá, a.s., Čelčova 1181, 203 Malá Bělá		Zak. číslo: VIS 2/11 - 028
ČS1 - SITUACE - ZPEVNĚNÉ PLOCHY		Měřítko: číslo přílohy: 1:500 C.3.1

STAVAJÍCÍ DOKUMENTACE

DVAŽBA 80mm
KLADECI VRSTVA 44/8 tl. 40 mm
DRČENÉ KAMENIVO d8/16 tl. 100
DRČENÉ KAMENIVO d16/32 tl. 100
DRČENÉ KAMENIVO d32/63 tl. 20
ŠTĚRKOPÍSEK d0/8 tl. 100 mm
ZÁSYP VÍRODNOU ZEMINOU
HUTNĚNÁ PLÁŇ

ASFALT AC011 tl. 50mm
ACL16 50 mm
ROZMĚSEČI Ž.B. DESKA 410x100 mm
VĚTRNÁ Č. 30/37 XFII

ASFALT AC011 tl. 50mm
ACL16 50 mm
ROZMĚSEČI Ž.B. DESKA 410x100 mm
VĚTRNÁ Č. 30/37 XFII

ASFALT AC011 tl. 50mm
ACL16 50 mm
ROZMĚSEČI Ž.B. DESKA 410x100 mm
VĚTRNÁ Č. 30/37 XFII

ASFALT AC011 tl. 50mm
ACL16 50 mm
ROZMĚSEČI Ž.B. DESKA 410x100 mm
VĚTRNÁ Č. 30/37 XFII

KÓTA POKLOPU ČSOVI
217.42

217.41


217.45

217.85

PROSTOR BUDE ZASYPÁN LOMOVÝM
KAMENÍM 63/125

SVODNICE NIH
SLOUPK U-140 S PÁRNÍ DESKOU

OPLOČENÍ ČS1



KÓTA POKLOPU ČS1
217.42

PODNIKOVÁ MOSTNÍ ŘÍMSA
4606-W60

PRŮČNÝ STĚP NA NOSTĚ 2%
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV

VODOHOSPODÁŘSK
K16/01/01 4

Vypracoval: Ing. M. Brada
Projektant: Ing. M. Brada
Ved. objektu:

DOSTAVBA KANALIZACE V MÍSTNÍ ČA

SO 05 - ČERPAČÍ STANICE ODPAL

Investor: VAK Jihlava Boh. slav. a.s., Čuchova 1151, 293 22 Mladá

ČS1 - REZA-A, B-B'


ASPHALTOVA PODLAHA

ALC 11 42 50mm
ACL 16 42 50mm

RAM

OPATNICE

Tržníky a 200 mm Ø 10
Podbitka včetně Ø 12
2x RAM sítě Ø 8 / 150 x 150 vč. dist. pásů

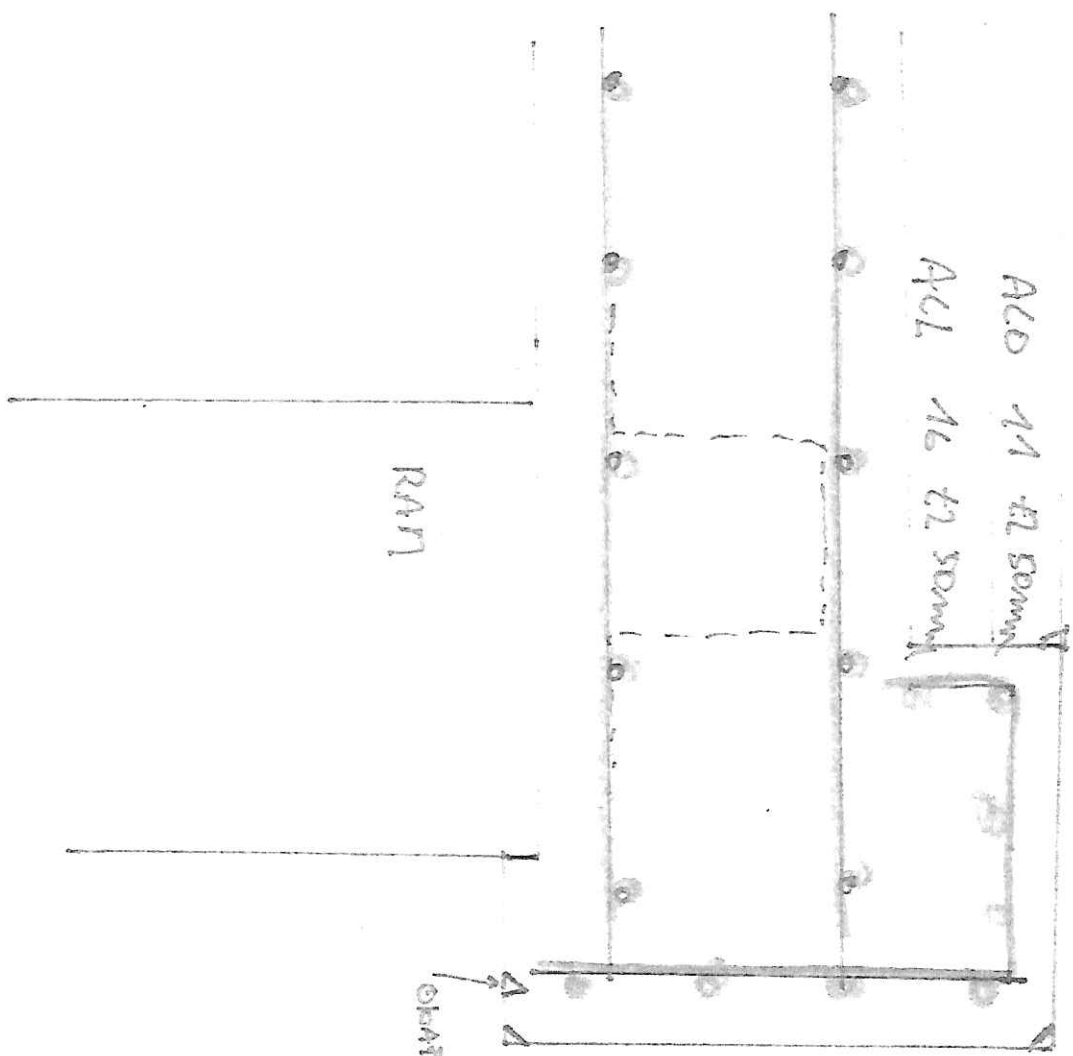



ZMĚNOVÝ LIST č. 012

rev projektu:

Odkanalizování obcí v povodí Jizery

o projektu:

CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007096

Objednatel: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Čechova 1151 293 22 Mladá Boleslav	Změnový list číslo:	012
Zhotovitel: Sdružení Odkanalizování obcí v povodí Jizery, část C; společnost Selská 517 460 01 Liberec XII	Datum vydání:	
Správce stavby: Sdružení „Garnets – Realstav MB“ Garnets Consulting a.s. Československých legií 445/4 415 01 Teplice	Číslo smlouvy:	

Název pod-projektu
SO/PS dotčené změnou:

Odkanalizování obcí v povodí Jizery – část C
10) **Horní Stakory Neuznatelné náklady stavby**
10) **Horní Stakory Uznatelné náklady stavby**

Stručný popis změny:

doměrkový rozpočet po dokončení prací

Popis změny, technického řešení:

- Skutečné provedení stavby podle geodetického zaměření

Původní řešení dle smluvní (zadávací dokumentace):

- Dle zadávací PD

Nové řešení:

- Délky tras všech liniových částí stavby byly upraveny dle geodetického zaměření. Jedná se jen o drobné odchylky v délkách jednotlivých stok, vodovodů či přípojek.

Zdůvodnění změny:

- Při realizaci došlo k drobným odchylkám v délkách z důvodu koordinace tras se stávajícími podzemními zařízeními.
- **Z hlediska ZZVZ jde o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222, odst. 4**

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

- | | |
|---|--------------------------------|
| a) zadávací dokumentace | ano |
| b) realizační (dílenská) dokumentace zhotovitele: | změna bude zapracována do DSPS |
| c) výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval: | není nutné zpracovávat |

Předpokládaný vliv na:

- | | |
|--------------|-----|
| a) termín | ne |
| b) kvalitu | ne |
| c) cenu díla | ano |

ZMĚNOVÝ LIST č. 012

Název projektu: Odkanalizování obcí v povodí Jizery
 Číslo projektu: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007096

Náklady na změnu	Změna se bude týkat pouze nezpůsobilých nákladů projektu			
	Vícepráce		Méněpráce	
	bez DPH	včetně DPH	bez DPH	včetně DPH
stavební náklady - uznatelné	0,- Kč	0,- Kč	-299 816,60 Kč	-362 778,09 Kč
stavební náklady - nezpůsobilé	206 327,97 Kč	249 656,84 Kč	0,- Kč	0,- Kč
celkem ZL č. 12 bez DPH	-93 488,63 Kč			
celkem ZL č. 12 vč. DPH	-113 121,24 Kč			

Změnu navrhuje:	Zhotovitel
------------------------	-------------------

Souhlas zhotovitele:	Zhotovitel se změnou souhlasí
-----------------------------	--------------------------------------

Datum: 29.07.2022

Jméno odpovědné osoby zhotovitele:

Ing. Martin Matzner

Podpis:

Razítko:

Ještědská stavební společnost spol. s r.o.
Selská 517, 460 01 Lihovec XII - Staré Pavlovice
 IČ: 18090357 DIČ: CZ18090357

Souhlas projektanta:	Projektant se změnou souhlasí
-----------------------------	--------------------------------------

Datum:

Jméno odpovědné osoby projektanta:

Ing. Roman Bárta

Podpis:

Razítko:

ŠINDLAR s.r.o.
Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové
 tel.: 495 402 560 • www.sindlar.cz
 IČ: 260 03 236, DIČ: CZ26003236

Souhlas a vyjádření správce stavby:	Správce stavby se změnou souhlasí
--	--

Datum:

Jméno odpovědné osoby správce stavby:

p. Jiří Bouma

Podpis:

③ SPRÁVCE STAVBY
 Sdružení „Gamets - Realstav MB”
 Gamets Consulting a.s.
 Realstav MB, spol. s r.o.

Odkanalizování obcí v povodí Jizery

Razítko:

ZMĚNOVÝ LIST č. 012

Název projektu: Odkanalizování obcí v povodí Jizery
Číslo projektu: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007096

Souhlas objednatele:

Objednatel se změnou souhlasí

Datum:

29.4. 2022

Jméno odpovědné osoby objednatele:

Ing. Tomáš Žitný



Podpis:

Razítko:

VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 88

Přílohy změnového listu:

1) Položkový rozpočet

Poznámka:

ZL011_Horní Stakory - Doměrkový rozpočet

-93 488,63

Horní Stakory - neuznatelné	206 327,97	Horní Stakory - uznatelné	-299 816,58
04 - Přípojky	78 486,68	03 - Vedlejší a ostatní náklady	-30 000,00
Nový objekt BD 1-4	259 442,78	SO 01.1. - Stoka A	-6 455,07
SO 04 - Kanalizační přípojky	299 314,75	SO 01.2. - Stoka A-1	-12 127,89
SO 05.1. - Přeložka vodovodu B-a	-8 345,31	SO 01.3. - Stoka B	-132 777,07
SO 05.2. - Přeložka vodovodu BA-b	13 763,45	SO 01.4. - Stoka BA	-6 774,84
SO 05.3. - Přeložka vodovodu BA-1-c	-6 156,44	SO 01.5. - Stoka BA-1	332,30
SO 05.4. - Přeložka vodovodu BB-d	2 586,89	SO 01.6. - Stoka BB	-12 858,20
SO 05.5. - Přeložka vodovodu BC-e	2 467,19	SO 01.7. - Stoka BC	16 067,71
SO 05.6. - Přeložka vodovodu BD-f1	663,57	SO 01.8. - Stoka BD	18 100,72
SO 05.7. - Přeložka vodovodu BD-f2	21 359,87	SO 01.9. - Stoka BD-1	21 831,44
SO 05.8. - Přeložka vodovodu BD-1-g1	6 438,05	SO 01.10. - Stoka BD-1-1	-57 075,17
SO 05.9. - Přeložka vodovodu BD-1-g2	-479 283,57	SO 01.11. - Stoka BD-1-2	9 751,58
SO 05.10 - Přeložka vodovodu BD-4-2-h	13 071,38	SO 01.13. - Stoka BD-1-3	-81 203,79
SO 06.1. - Přeložka STL plynovodu	2 518,69	SO 01.14. - Stoka BD-2	7 413,88
		SO 01.16. - Stoka BD-4	-3 784,54
		SO 01.17. - Stoka BD-4-1	-1 680,11
		SO 01.19. - Stoka BD-4-3	5 965,74
		SO 01.20. - Stoka BD-4-4	-9 168,65
		SO 01.21. - Stoka BD-4-5	615,40
		SO 01.22. - Stoka BD-4-6	-27 240,71
		SO 01.23. - Stoka BD-4-7	-179,28
		SO 01.24. - VÝTLAK V3	4 271,18
		SO 02.1. - Výtlačný řad V1	994,66
		SO 02.2. - Přípojka NN, ČS 1	-724,68
		SO 03.1. - Výtlačný řad V2	63,15
		SO 03.2. - Přípojka NN, ČS 2	-3 174,34

-0,02

Haléřové vyrovnání



ZMĚNOVÝ LIST č. 013

projektu: Odkanalizování obcí v povodí Jizery
projektu: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007096

Objednatel: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Čechova 1151 293 22 Mladá Boleslav	Změnový list číslo:	013
Zhotovitel: Sdružení Odkanalizování obcí v povodí Jizery, část C; společnost Selská 517 460 01 Liberec XII	Datum vydání:	
Správce stavby: Sdružení „Garnets – Realstav MB“ Garnets Consulting a.s. Československých legií 445/4 415 01 Teplice	Číslo smlouvy:	

Název pod-projektu
SO/PS dotčené změnou:

Odkanalizování obcí v povodí Jizery – část C
02) *Hrdlořezy Neuznatelné náklady stavby*
02) *Hrdlořezy Uznatelné náklady stavby*

Stručný popis změny:

doměrkový rozpočet po dokončení prací

Popis změny, technického řešení:

- Skutečné provedení stavby podle geodetického zaměření

Původní řešení dle smluvní (zadávací dokumentace):

- Dle zadávací PD

Nové řešení:

- Délky tras všech liniových částí stavby byly upraveny dle geodetického zaměření. Jedná se jen o drobné odchylky v délkách jednotlivých stok, vodovodů či přípojek.

Zdůvodnění změny:

- Při realizaci došlo k drobným odchylkám v délkách z důvodu koordinace tras se stávajícími podzemními zařízeními.
- Z hlediska ZZVZ jde o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222, odst. 4

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

- | | |
|---|--------------------------------|
| a) zadávací dokumentace | ano |
| b) realizační (dílenská) dokumentace zhotovitele: | změna bude zapracována do DSPS |
| c) výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval: | není nutné zpracovávat |

Předpokládaný vliv na:

- | | |
|--------------|-----|
| a) termín | ne |
| b) kvalitu | ne |
| c) cenu díla | ano |

ZMĚNOVÝ LIST č. 013

Název projektu: Odkanalizování obcí v povodí Jizery
 Číslo projektu: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007096

Náklady na změnu	Změna se bude týkat pouze nezpůsobilých nákladů projektu			
	Vícepráce		Méněpráce	
	bez DPH	včetně DPH	bez DPH	včetně DPH
stavební náklady - uznatelné	0,- Kč	0,- Kč	-498 105,71 Kč	-602 707,91 Kč
stavební náklady - nezpůsobilé	247 920,16 Kč	299 983,39 Kč	0,- Kč	0,- Kč
celkem ZL č. 013 bez DPH	-250 185,16 Kč			
celkem ZL č. 013 vč. DPH	302 724,04 Kč			

Změnu navrhuje: _____ **Zhotovitel**

Souhlas zhotovitele: _____ **Zhotovitel se změnou souhlasí**


Datum: 29.07.2022

Jméno odpovědné osoby zhotovitele:

Ing. Martin Matzner

Podpis:

Razítko:

Ještědská stavební společnost
 spol. s r.o. 
 Selská 517, 460 01 Lhèrečín - Staré Pavlovice
 IČ: 10202550 DiČ: CZ18302550

Souhlas projektanta: _____ **Projektant se změnou souhlasí**

Datum:

Jméno odpovědné osoby projektanta:

Ing. Roman Bárta

Podpis:

Razítko:

ŠINDLAR s.r.o.
 Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové
 tel.: 495 402 560 • www.sindlar.cz
 IČ: 260 03 236, DIČ: CZ26003236

Souhlas a vyjádření správce stavby: _____ **Správce stavby se změnou souhlasí**

Datum:

Jméno odpovědné osoby správce stavby:

p. Jiří Bouma

Podpis:

© **SPRÁVCE STAVBY**
 Sdružení „Garnets - Realstav MB”
 Garnets Consulting a.s.
 Realstav MB, spol. s r.o.
 Odkanalizování obcí v povodí Jizery

Razítko:

ZMĚNOVÝ LIST č. 013

Název projektu: Odkanalizování obcí v povodí Jizery
Číslo projektu: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007096

Souhlas objednatele:

Objednatel se změnou souhlasí

Datum:

29.4. 2022

Jméno odpovědné osoby objednatele:

Ing. Tomáš Žitný



Podpis:

Razítko:

VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 88

Přílohy změnového listu:

1) Položkový rozpočet

Poznámka:

Odkanalizování obcí v povodí Jizery
2) Hrdlořezy, výstavba kanalizace

Stanovení skutečných délek vybudovaných kanalizačních stok a vodovodních řadů

Název řadu	délka (m)	Geodeticky zaměřeno (m)						Souřadnice Y konce	Poznámka
		materiál, DN	délka	Zaokrouhleno pro vykazování	Souřadnice X začátku	Souřadnice Y začátku	Souřadnice X konce		
Stoka A	1335,92	KT250	1 332,90	1 332,9	1006989,76	705131,15	1007892,17	704664,98	
Stoka AB	96,10	KT 250	98,40	98,4	1007698,37	704904,09	1007674,49	704998,28	
Stoka AC	494,20	KT 250 LT 250	450,90 42,04	450,9 42,0	1007601,51 1007601,51	704913,30 704913,30	1007339,65 1007640,88	705266,29 704928,00	Š47 -> Š15 LT 250 42,04m
Stoka AC-1	35,40	KT 250	33,57	33,6	1007598,33	704890,79	1007582,46	704919,71	
Stoka AC-2	35,00	KT 250	35,59	35,6	1007470,20	705032,43	1007502,45	705047,42	
Stoka AC-3	53,60	KT 250	63,60	63,6	1007413,86	705206,88	1007366,82	705164,13	
Stoka AD	13,40		0,00	0,0					neralizováno
Stoka AE	89,40	KT 250	92,86	92,9	1007169,54	705414,11	1007230,41	705344,68	
Stoka AF	96,40	KT 250	96,87	96,9	1007015,32	705109,06	1007047,36	705196,08	
Stoka AG	200,30	KT 250	200,68	200,7	1006858,79	705294,02	1007018,65	705172,80	
Stoka AG-1	76,90	KT 250	79,26	79,3	100693,19	705336,75	1006878,62	705279,43	
Stoka B	111,70	KT 250 LT 200	109,24 1,07	109,2 1,1	1007937,14 1007937,14	704715,31 704715,31	1007994,40 1007937,68	704801,87 704716,23	Š171 -> ČSOV1 LT 200 1,07m
Stoka B-1	25,80	KT 250	25,01	25,0	1007937,14	704715,31	1007916,15	704728,86	
Stoka C	164,50	KT 250 LT 200	161,79 1,96	161,8 2,0	1007765,55 1007765,55	704917,20 704917,20	1007832,28 1007764,43	704773,48 704915,60	Š87 -> ČSOV2 LT200 1,96m
Stoka C-1	330,80	KT 250	328,53	328,5	1007765,55	704917,20	1007640,14	705211,08	
Stoka C-1-1	31,30	KT 250	31,10	31,1	1007709,68	705063,77	1007706,20	705094,66	
Stoka C-1-2	43,00	KT 250	43,78	43,8	1007703,52	705062,35	1007712,44	705019,61	
Stoka C-2	224,10	KT 250	223,38	223,4	1007773,64	704905,03	1007972,03	704828,66	
Stoka D	201,80	KT 250 LT 200	192,15 9,66	192,2 9,7	1007082,42 1006999,8	705447,09 705550,81	1006999,80 1006991,75	705550,81 705556,15	Š114 -> ČSOV3 LT 200 9,66m
Stoka E	188,80	KT 250 LT 200	160,79 5,04	160,8 5,0	1006995,84 1006839,52	705045,57 705031,49	100,6867,77 1006834,51	705034,70 705032,00	Š123 -> ČSOV4 LT 200 5,04m
Stoka E-1	79,00	KT 400 KT 250	28,43 117,28	28,4 117,3	1006839,52 1006974,00	705031,49 704971,84	100,6867,77 1006911,28	705034,70 705055,34	prodloužení na žádost obce
Stoka F	319,60	KT 250 LT 200	313,68 3,84	313,7 3,8	1006836,77 1006561,80	705309,41 705375,83	1006561,80 1006565,59	705375,83 705375,23	Š135 -> ČSOV5 LT 200 3,84m
Stoka F-1	390,70	KT 250	391,18	391,2	1006881,29	705158,87	1006561,80	705375,83	
Stoka F-1-1	80,30	KT 250	81,18	81,2	1006479,98	705372,01	1006560,99	705371,87	

ZL013 Doměrkový rozpočet_Hrdlořezy

-250 185,16

Hrdlořezy - neuznatelné	-498 105,71		247 920,55
SO 08.1. - Přeložka vodovodu A-a	-237 810,50	01 - Přivaděč	7 078,95
SO 08.2. - Přeložka vodovodu A-b	32 898,09	SO 01.1. - Stoka A	11 170,76
SO 08.3. - Přeložka vodovodu A-c	24 189,83	SO 01.2. - Stoka AB	17 006,70
SO 08.4. - Přeložka vodovodu AE-a	-6 504,07	SO 01.3. - Stoka AC	-42 267,35
SO 08.5. - Přeložka vodovodu AG-a	-22,18	SO 01.4. - Stoka AC-1	-45 304,80
SO 08.6. - Přeložka vodovodu AG-b	61 736,08	SO 01.5. - Stoka AC-2	5 520,16
SO 08.7. - Přeložka vodovodu C-1-a	-33 394,04	SO 01.6. - Stoka AC-3	120 337,18
SO 08.8. - Přeložka vodovodu D-a	-4 517,65	SO 01.7. - Stoka AD	-200 126,96
SO 08.9. - Přeložka vodovodu E-1-a	-70 138,94	SO 01.8. - Stoka AE	51 580,32
SO 08.10. - Přeložka vodovodu F-a	6 210,77	SO 01.9. - Stoka AF	2 540,20
SO 08.11. - Přeložka vodovodu F-b	633,49	SO 01.10. - Stoka AG	3 052,23
012 - Přípojky	525 920,74	SO 01.11. - Stoka AG-1	34 389,18
SO 09.1. - Přeložka dešťové kanalizace	-797 307,34	SO 01.12. - Stoka B	-6 006,72
		SO 01.13. - Stoka B-1	-5 718,15
		SO 01.14. - Stoka C	-10 742,49
		SO 01.15. - Stoka C-1	-16 682,84
		SO 01.16. - Stoka C-1-1	-2 004,52
		SO 01.18. - Stoka C-2	-4 603,88
		SO 01.19. - Stoka D	21 907,97
		SO 01.20. - Stoka E	105 281,83
		SO 01.21. - Stoka E-1	645 217,30
		SO 01.22. - Stoka F	5 746,03
		SO 01.23. - Stoka F-1	-9 808,64
		SO 01.24. - Stoka F-1-1	5 655,14
		SO 01.25. - Stoka F-2	-36 220,56
		SO 02.1. - Výtlačný řad V1	90 750,64
		SO 02.2. - Přípojka NN	-8 666,23
		SO 02.3. - Komunikace , zpevněné plochy	6 330,46
		SO 03.2. - Přípojka NN	-8 908,63
		SO 03.3. - Oplocení	-357,01
		SO 03.4. - Komunikace, zpevněné plochy	-246,72
		SO 04.3. - Oplocení	-10 948,31
		SO 04.4. - Komunikace, zpevněné plochy	-10 560,17
		SO 04.1. - Výtlačný řad V3	-2 297,67
		SO 04.2. - Přípojka NN	-1 627,73
		SO 05.1. - Výtlačný řad V4	32 404,23
		SO 05.2. - Přípojka NN	-2 510,53
		SO 05.3. - Komunikace, zpevněné plochy	-7 758,34
		SO 06.3. - Oplocení	-2 142,06
		SO 06.4. - Komunikace, zpevněné plochy	-9 864,59
		SO 06.1. - Výtlačný řad V5	-6 098,34
		SO 06.2. - Přípojka NN	-7 784,79
		03 - SO 07 Kanalizační přípojky	-428 790,67
		04 - Vedlejší a ostatní náklady	-30 000,00



ZMĚNOVÝ LIST č. 014

projektu: Odkanalizování obcí v povodí Jizery
projektu: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007096

Objednatel: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Čechova 1151 293 22 Mladá Boleslav	Změnový list číslo: 014
Zhotovitel: Sdružení Odkanalizování obcí v povodí Jizery, část C; společnost Selská 517 460 01 Liberec XII	Datum vydání:
Správce stavby: Sdružení „Garnets – Realstav MB“ Garnets Consulting a.s. Československých legií 445/4 415 01 Teplice	Číslo smlouvy:

Název pod-projektu
SO/PS dotčené změnou:

Odkanalizování obcí v povodí Jizery – část C
06) Malá Bělá, výstavba kanalizace, *Uznatelné náklady*
06) Malá Bělá, výstavba kanalizace, *Neznatelné náklady*

Stručný popis změny:

doměrkový rozpočet

Popis změny, technického řešení:

- Skutečné provedení stavby podle geodetického zaměření, změna vedení trasy stoky C-3 z důvodu zastižení velkého propustku, se kterým projekt neuvažoval, změna technologie výstavby kanalizačních přípojek na stoce C, C-5 a C-5.1. Na žádost objednatele byl změněn typ trubního materiálu přeložky vodovodu z PE na LT.

Původní řešení dle smluvní (zadávací dokumentace):

- Stoka C-3 měla být vedena v komunikaci KSÚS od Dolánek až k železničnímu přejezdu, ale v blízkosti připojení stoky C-3.1. byl zastižen velmi hluboký propustek na odvádění dešťových vod, jehož podkopání by z důvodu přítomnosti skalního podloží bylo velmi problematické a nákladné a došlo by k velkému zahloubení stoky C-3. Projekt uvažoval, že KNL přípojky v komunikaci KSÚS budou pod druhou polovinou vozovky bezvýkopově vrtány aby nemusela být opravována celá komunikace, při realizaci se ale zjistilo, že je zde skalní podloží, které neumožní plánovaným způsobem přípojky v komunikaci KSÚS provést. U přeložky vodovodu počítal projekt s použitím potrubí z PE.

ZMĚNOVÝ LIST č. 014

Název projektu: Odkanalizování obcí v povodí Jizery
 Číslo projektu: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007096

<p>Nové řešení: Délky tras všech liniových částí stavby byly upraveny dle geodetického zaměření. Jedná se jen o drobné odchylky v délkách jednotlivých stok, vodovodů či přípojek. Z důvodu zastižení propustku dešťových vod v trase stoky C-3 bylo nutné upravit trasu stoky C-3, změnu zpracoval projektant. U kanalizačních přípojek na stokách C, C-5.1 a C-5 z důvodu zastižení skalního podloží, bylo nutné jejich projektem navržené bezvýkopové provedení nahradit klasickým výkopem s frézováním skalního podloží, se správcem komunikace KSÚS se podařilo dohodnout spolupráci na opravě jejich komunikace, takže opravu druhé poloviny vozovky uhradila KSÚS. Pro přeložku vodovodu byl použit trubní materiál z tvárné litiny z důvodu větší životnosti tohoto trubního materiálu.</p>						
<p>Zdůvodnění změny:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Při realizaci došlo k drobným odchylkám v délkách z důvodu koordinace tras se stávajícími podzemními zařízeními. Na stoce C3 z důvodu zastižení rozměrného propustku v projektované trase kanalizace bylo nutné zpracovat projektantem úpravu trasy. Kanalizační přípojky na stokách C, C-5.1 a C-5 v komunikaci KSÚS nebylo možné provést pod druhou polovinou vozovky bezvýkopově a technologie vrtání byla nahrazena otevřeným výkopem s rozpojením skalního podloží. - Z hlediska ZZVZ jde o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222, odst. 4 						
<p>Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%;">a) zadávací dokumentace</td> <td style="width: 40%;">ano</td> </tr> <tr> <td>b) realizační (díleňská) dokumentace zhotovitele:</td> <td>změna bude zapracována do DSPS</td> </tr> <tr> <td>c) výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:</td> <td>Objednatel (pro změnu trasy stoky C-3)</td> </tr> </table>	a) zadávací dokumentace	ano	b) realizační (díleňská) dokumentace zhotovitele:	změna bude zapracována do DSPS	c) výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	Objednatel (pro změnu trasy stoky C-3)
a) zadávací dokumentace	ano					
b) realizační (díleňská) dokumentace zhotovitele:	změna bude zapracována do DSPS					
c) výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	Objednatel (pro změnu trasy stoky C-3)					
<p>Předpokládaný vliv na:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%;">a) termín</td> <td style="width: 40%;">ano</td> </tr> <tr> <td>b) kvalitu</td> <td>ne</td> </tr> <tr> <td>c) cenu díla</td> <td>ano</td> </tr> </table>	a) termín	ano	b) kvalitu	ne	c) cenu díla	ano
a) termín	ano					
b) kvalitu	ne					
c) cenu díla	ano					

Náklady na změnu	Změna se bude týkat způsobilých a nezpůsobilých nákladů projektu			
	Vícepráce		Méněpráce	
	bez DPH	včetně DPH	bez DPH	včetně DPH
stavební náklady - způsobilé	0,- Kč	0,- Kč	-451 735,95,- Kč	-546 600,50 Kč
stavební náklady - nezpůsobilé	2 869 774,36 Kč	3 472 426,98 Kč	0,- Kč	0,- Kč
celkem ZL č. 014 bez DPH	2 418 038,41 Kč			
celkem ZL č. 014 vč. DPH	2 925 826,48 Kč			

Změnu navrhuje:	Zhotovitel a Objednatel
------------------------	--------------------------------

ZMĚNOVÝ LIST č. 014

Název projektu:

Odkanalizování obcí v povodí Jizery

Číslo projektu:

CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007096

Souhlas zhotovitele:

Zhotovitel se změnou souhlasí

Datum: 29.07.2022

Jméno odpovědné osoby zhotovitele:

Ing. Martin Matzner

Podpis:

Razítko:

Juhovské inženýrské společnosti
spol. s r.o. ①
Šolská 517, 460 01 Liberec XII - Staré Pavlovice
IČ: 18382550 DIČ: CZ18382550

Souhlas projektanta:

Projektant se změnou souhlasí

Datum: 29.7.2022

Jméno odpovědné osoby projektanta:

Ing. Martin Butor

Podpis:

Razítko:

Vodohospodářské inženýrské služby,
akciová společnost ①
Křížová 472/47
150 00 Praha 5

Souhlas a vyjádření správce stavby:

Správce stavby se změnou souhlasí

Datum:

Jméno odpovědné osoby správce stavby:

p. Jiří Bouma

Podpis:

Razítko:

③ SPRÁVCE STAVBY
Sdružení „Garnets - Realstav MB”
Garnets Consulting a.s.
Realstav MB, spol. s r.o.
Odkanalizování obcí v povodí Jizery

Souhlas objednatele:

Objednatel se změnou souhlasí

Datum: 29.7.2022

Jméno odpovědné osoby objednatele:

Ing. Tomáš Žitný

Podpis:

Razítko:

VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 88

Přílohy změnového listu:

1) Položkový rozpočet

Poznámka:

Odkanalizování obcí v povodí Jizery
 6 Malá Bělá, výstavba kanalizace
 Stanovení skutečných délek vybudovaných sítí

Prof. č.	Projektováno, obsaženo ve zmiňané ROPD			Geodeticky zaměřeno (m)										Souřadnice X konce	Souřadnice Y začátku	Souřadnice X začátku	Souřadnice Y konce	Poznámka
	Název řádu	m:at	DN/d (mm)	délka (m)	materiál, DN	délka	Zaokrouhle no pro vykazování	Souřadnice Y začátku	Souřadnice X začátku	Souřadnice Y konce	Souřadnice X konce							
Stoika C		KT	250	375,07	KT 250	399,37	399,4	701291,07	1003740,25	701621,47	1003440,21	celkem stoika c 464,6						
Stoika C-1	465,00	HDPE	200	75,17	KT400	50,63	50,6	701291,07	1003740,25	701621,47	1003440,21	prodloužení z důvodu nere realizace stok C-6 a C-6.1 a ČSOV 3						
Stoika C-1	356,50	KT	400	197,40	KT250	375,72	375,7	701299,13	1003752,36	701231,67	1004256,74	535,0						
Stoika C-2.1		KT	250	159,30	KT400	159,30	159,3	701305,06	1003746,36	701367,21	1003840,09							
Stoika C-2.2		KT	250	30,89	KT250	30,89	30,9	701312,20	1003773,05	701343,03	1003774,93							
Stoika C-2.2.1		KT	250	202,00	KT250	201,92	201,9	701309,63	1003845,95	701259,74	1004041,45							
Stoika C-3	706,00	KT	250	32,00	KT250	32,01	32,0	701282,57	1003966,25	701311,75	1003978,94	oprava trasy z důvodu kolize s propustkem, částečně vedeno v trase stoiky C-3.1.1 a C-3.1						
Stoika C-3.1		KT	250	689,00	KT250	787,31	787,3	701341,20	1003724,23	701997,34	1003855,76							
Stoika C-3.1.1		KT	250	17,00	KT250	12,51	12,5	701512,46	1003746,97	701632,20	1003549,79	v trase vedena stoika C-3						
Stoika C-3.1.2		KT	250	223,00	KT250	170,19	170,2	701560,43	1003770,30	701666,12	1003675,66	v trase vedena stoika C-3						
Stoika C-4		KT	250	217,00	KT250	212,19	212,2	701616,72	1003771,32	701798,84	1003707,25							
Stoika C-4.1		KT	250	71,00	KT250	71,23	71,2	701416,61	1003651,27	701467,68	1003700,56							
Stoika C-5	155,00	KT	250	63,00	KT250	64,33	64,3	701441,65	1003673,86	701404,71	1003726,44							
Stoika C-5.1		KT	250	149,98	KT250	150,75	150,8	701820,99	1003248,15	701937,28	1003152,62							
Stoika C-5.2	466,00	HDPE	200	5,02	HDPE d250	5,06	5,1	701817,77	1003244,25	701627,81	1003429,32							
Stoika C-5.2.1		KT	250	265,00	KT250	264,91	264,9	701894,64	1003181,77	701641,49	1003536,56							
Stoika C-5.2.2		KT	250	16,00	KT250	14,62	14,6	701894,64	1003181,77	701641,49	1003536,56							
Stoika C-6		KT	250	450,00	KT 250	443,55	443,6	701683,78	1003476,77	701671,64	1003670,22	Po vypuštění ČSOV 3 nahrazeno stokou C-1						
Výlačný řád V1		HDPE	d 90	39,28		0,00	0,0	701289,65	1003740,28	701223,72	1003618,77							
Výlačný řád V2		HDPE	d 90	143,00		0,00	0,0	701621,47	1003440,21	701820,65	1003249,62	Nerealizováno z důvodu zrušení ČSOV 3						
Výlačný řád V3		HDPE	d 90	30,33		0,00	0,0	701910,29	1003203,04	701967,24	1003167,20							
Celkem způsobilé				4 692,48		4 593,69	4 593,7					realizováno z materiálu LT						
Přeložka vodovodu 1		HDPE	d 90	39,28		0,00	0,0					realizováno z materiálu LT						
Přeložka vodovodu 2		HDPE	d 90	143,00		0,00	0,0											
Přeložka dešťové kanalizace KT DN 300mm		KT		30,33	KT250	25,73	25,7	701316,73	1003797,78	701314,36	1003823,30							
Obnova vodovodu 1, Změna č. 1					LT 80	153,96	154,0	701442,80	1003767,99	701938,64	1003152,82							
Obnova vodovodu 1.1 Změna č. 1					LT 100	725,44	725,4	701441,88	1003675,19	701462,20	1003693,30							
Obnova vodovodu 2 Změna č. 1					LT 80	27,22	27,2	701457,58	1003775,79	701966,30	1003168,66							
Přeložka vodovodu "u restaurace Růžkočka"				212,61	LT100	111,63	111,6	701417,28	1003653,14	701339,40	1003729,99	realizováno mimo projekt Jizera						
Celkem nezpůsobilé				1 865,58		1 865,5	1 865,5											
Celkem vše				4 905,09		6 459,27	6 459,27											

Další:

Připojka NN ČSO1 1				2D délka/3D délka	14,42/17,02	14,4	701286,07	1003752,20	701288,90	1003740,98	
Připojka NN ČSOV 2				2D délka/3D délka	39,87/43,14	39,9	701837,88	1003222,42	701825,00	1003247,92	
délky odboček k hydrantům, vzdálením na vodovodu 1					4,45	4,5					
délky odboček k hydrantům, vzdálením na vodovodu 2					8,68	8,7					
Připojky gavičání	ks	205	199	způsobilé							
Připojky gavičání	m	1435	991,78	nezpůsobilé							
Připojky tlakové	ks	0	1	celkem							
Připojky tlakové	m	0	3,75								
Kanalizační připojky celkem	m	1435									
Kanalizační připojky celkem	ks	210									

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 19-03-5
 Stavba: Dostavba kanalizace v místní části Malá Bělá, uznatelné náklady
 Místo: Malá Bělá Datum: 16. 3. 2019
 Zadavatel: Město Bakov nad Jizerou Projektant: VIS, a.s.
 Uchazeč: Pracovatel: VIS, a.s.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
01	SO 01 - Gravitační kanalizace	75 221 234,63	91 017 693,90	STA
02	SO 02 - Tlaková kanalizace	55 073 708,55	66 639 187,35	STA
03	SO 04 - Kanalizační přípojky	2 754 580,95	3 333 055,05	STA
04	SO 05.1 - Čerpací stanice odpadních vod ČS1	6 137 387,84	7 426 239,29	STA
05	SO 05.2 - Čerpací stanice odpadních vod ČS2	2 047 575,46	2 477 586,31	STA
06	SO 05.3 - Čerpací stanice odpadních vod ČS3	2 063 401,45	2 496 715,75	STA
07	SO 06 - Přípojky NN	1 090 605,29	1 319 632,40	STA
08	SO 07 - Příjezdová komunikace a zpevněné plochy	343 155,60	415 218,28	STA
09	SO 08 - Oplotení	833 868,87	1 008 981,33	STA
10	VRN	89 202,52	107 935,05	STA
		4 787 738,10	5 793 163,10	VON

Doměřkový rozpočet	ZL001 Přeložka vodovodu	ZL002 Čerpadla	ZL003 Kanalizace	ZL010 neprovedené práce
2 193 328,54	0,00	20 606,30	147 000,01	1 400 676,10
-387 671,32			147 000,01	308 676,30
-64 064,63				
2 645 064,49				
0,00				
0,00				
0,00		28 565,30		
0,00				
0,00				
0,00				
0,00				
0,00				
0,00				
0,00				
0,00				

SOUHRN PRACÍ

Stavba: Dostavba kanalizace v místě části Malá Bělá, uzrnatelné náklady

Objekt: 02 - SO 02 - Tlaková kanalizace

Místo: Datum: 16. 3. 2019
 Zadavatel: Město Bakov nad Jizerou
 Uchazeč: Výpil údaj Projektant: VIS a.s.
 Zpracovatel: Zpracovatel

projekt: 447,55
 skutečnost: 435,30
 koeficient pi: -0,02737

Pr.č. Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							
o HSV					2 754 590,95	2 664 621,41	
d 1 Zernní práce					1 276 492,04		
1	K	Odstavení pokladu pi přes 200 m2	m2	291,200	71,40	20 781,66	
2	K	Odstavení pokladu pi přes 500 m2	m2	64,800	23,80	1 542,24	
3	K	Zvedání 150 mm potrubí pi přes 200 m2	m2	228,400	29,76	6 787,66	
4	K	Odstavení živého nájezdu	m2	291,200	107,10	31 187,52	
5	K	rozvozlání pi přes 500 m2 x 150 mm	m	7,200	300,56	2 380,03	
6	K	Dokrasa zajištění kabelu a	m	0,800	398,66	317,34	
7	K	rozvozlání potrubí z 8 vrstev klenutých	m3	32,280	95,20	3 073,06	
8	K	Průhledy za zřízení výkopů v	m3	30,400	418,51	12 661,90	
9	K	Průhledy za zřízení výkopů v	m3	186,035	418,51	77 465,44	
10	K	Průhledy za zřízení výkopů v	m3	124,023	418,51	51 696,82	
11	K	Průhledy za zřízení výkopů v	m3	93,018	478,01	44 277,50	
12	K	Průhledy za zřízení výkopů v	m3	93,018	478,01	44 277,50	
13	K	Průhledy za zřízení výkopů v	m3	124,023	535,51	66 415,59	
14	K	Různé horizontální vrstevní tlakové do	m	15,000	1 765,04	26 475,60	
15	K	Zřízení příčkových páteří a rozepnutí	m2	1 939,520	47,60	92 321,15	
16	K	Zřízení příčkových páteří a	m2	1 939,520	47,60	92 321,15	
17	K	Zřízení příčkových páteří a	m2	38,340	53,56	2 053,49	
18	K	Světla přeměňující výstupky z horniny	m3	403,076	101,16	40 775,17	
19	K	Světla přeměňující výstupky z horniny	m3	403,076	101,16	40 775,17	
20	K	Světla přeměňující výstupky z horniny	m3	217,041	101,16	21 955,87	
21	K	Světla přeměňující výstupky z horniny	m3	217,041	238,01	51 667,93	
22	K	Příplatek k vodotěmnému přeměňující	m3	1 302,246	32,25	41 997,43	
23	K	Nákladní výstupky z horniny (f. 5 až 7)	m3	217,041	119,00	25 827,86	
24	K	Průhledy za zřízení výkopů ze	m3	462,399	478,01	220 639,59	
25	K	Průhledy za zřízení výkopů ze	m3	462,399	228,10	105 283,57	
26	K	Průhledy za zřízení výkopů ze	m3	462,399	478,01	220 639,59	
27	K	Průhledy za zřízení výkopů ze	m3	462,399	478,01	220 639,59	
28	K	Průhledy za zřízení výkopů ze	m3	462,399	478,01	220 639,59	
29	K	Průhledy za zřízení výkopů ze	m3	462,399	478,01	220 639,59	
30	K	Průhledy za zřízení výkopů ze	m3	462,399	478,01	220 639,59	
31	K	Průhledy za zřízení výkopů ze	m3	462,399	478,01	220 639,59	
32	K	Průhledy za zřízení výkopů ze	m3	462,399	478,01	220 639,59	
33	K	Průhledy za zřízení výkopů ze	m3	462,399	478,01	220 639,59	
34	K	Průhledy za zřízení výkopů ze	m3	462,399	478,01	220 639,59	
35	K	Průhledy za zřízení výkopů ze	m3	462,399	478,01	220 639,59	
36	K	Průhledy za zřízení výkopů ze	m3	462,399	478,01	220 639,59	
37	K	Průhledy za zřízení výkopů ze	m3	462,399	478,01	220 639,59	
38	K	Průhledy za zřízení výkopů ze	m3	462,399	478,01	220 639,59	
39	K	Průhledy za zřízení výkopů ze	m3	462,399	478,01	220 639,59	

SKUTEČNOST		ZL003 komunikační	ZL002 ČSOV 3	ZL004 obec	ZL010 neprovedené práce
		méněpráce	méněpráce	méněpráce	méněpráce
		vícepráce	vícepráce	vícepráce	vícepráce
2 381 913,52		0,00	0,00	0,00	-308 605,38
194,57	13 892,30	-6 899,39	-84,66	-6 300,32	-308 605,38
1 500,11	63,03	-42,13	-128,96	-3 137,65	
2 715,30	81,24	-135,16	-123,98	-13 811,63	
16 522,32	154,27	-14 665,20	-4,2	-1 308,36	
3,00	991,68	0,00	0,00	0,00	
317,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 969,26	31,40	0,00	0,00	0,00	
8 665,41	20,00	0,00	0,00	0,00	
11 604,28	152,42	-14 000,07	-19,03	-7 924,52	
63 482,37	101,00	-9 338,19	-14,27	-8 792,19	
42 318,67	76,20	-8 006,49	-14,27	-6 792,19	
36 271,01	101,00	-12 006,13	-18,03	-10 168,61	
54 408,42	15,00	0,00	-33,3	-3 388,63	
28 775,60	1 588,75	-16 699,51	-297,65	-14 169,57	
76 624,64	1 588,75	-16 699,51	-297,65	-14 169,57	
76 624,64	37,28	-59,21	-61,87	-6 238,77	
1 997,28	37,28	-59,21	-33,3	-3 388,63	
1 997,28	300,17	-7 314,64	-33,3	-7 395,73	
33 408,33	177,80	-3 869,59	-33,3	-7 395,73	
17 586,28	177,80	-3 869,59	-199,89	-6 448,39	
42 318,25	1 065,71	-7 395,97	-33,31	-3 884,37	
34 401,46	177,79	-4 670,63	-43,29	-20 606,47	
21 157,05	231,71	-24 390,28	69,45	-15 703,64	
110 296,32	370,55	-18 502,27	61,87	-6 062,76	
83 781,30	330,17	-9 542,96	-19,49	-5 795,47	
43 219,69	104,07	-6 832,99	-25,02	-8 551,53	
30 582,88	35 040,00	-1170,42	-28,80	-13 924,42	
35 040,00	250,24	-16 416,54	16,48	16,48	
74 449,85	313,96	-52,66	-42,80	16,48	
1 971,23	313,96	-52,66	-42,80	16,48	
1 971,23	313,96	-52,66	-42,80	16,48	
2 942,24	313,96	-52,66	-42,80	16,48	
37 361,78	313,96	-52,66	-42,80	16,48	
5 607,41	313,96	-52,66	-42,80	16,48	
1 871,23	313,96	-52,66	-42,80	16,48	
3 738,18	31,40	-105,14	-0,84	0,00	
17 693,30	4,25	0,00	0,00	0,00	
18 082,35	30,39	0,00	0,00	0,00	
18 082,35	30,39	0,00	0,00	0,00	
24 782,27	0,60	0,00	0,00	0,00	

Demontáž rozpočet

-64 064,63

ROZDÍL=ZL-DR

-372 677,44

0,01

-569,06

-1,77

-184,51

-83,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 19-03-6

Stavba: Dostavba kanalizace v místní části Malá Bělá, neuznatelné náklady

Místo: Malá Bělá

Zadavatel: Město Bakov nad Jizerou

Uchazeč:

Datum: 18. 3. 2019

Projektant: VIS, a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
01	SO 03 - Přeložky vodovodu	707 563,41	856 151,73	STA
02	SO 09 - Oprava komunikace SÚS	5 657 890,16	6 846 047,09	STA
03	VRN	0,00	0,00	STA
		6 365 453,57	7 702 198,82	

Doměrkový rozpočet	ZL001 Přeložka vodovodu	ZL002 ČSOV 3	ZL007 komunikace	ZL010 neprovedené práce
224 709,87	10 763 674,08	0,00	-2 143 129,07	0,00
224 709,87	10 763 674,08		-2 143 129,07	
0,00				

SOUPLIS PRACÍ

Stavba: Doplňková kanalizace v místní části Malá Bělá, naurzantně náklady

Objekt: 01 - SO 03 - Přeložky vodotvodu

Místo: Město Blávkov nad Jizerou

Zadavatel: Vypřil Údaj

Uchazeč: Zpracovatel

Datum: 18.3.2019

Projekční: VIS, a.s.

Pracovní: 707 653,41

Cena celkem (CZK): 691 926,76

Cena celkem (CZK): 419 828,01

projekt
skutečnost
koeficient 0,00
0,00
0,00000

PČ	Kód	M.J.	Popis	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Domeňový rozpočet	HODNOTA ZLÚR	SKUTEČNOST		Z008 neprovedená práce	
									méněpráce	vícepráce		
Náklady souplisu celkem												
D HSB Práce a dodávky HSB												
D	1		Zemní práce				224 709,87	10 988 383,95	0,00	11 695 947,36	0,00	
1	K	113107225	Očištění postelů p. přes 200 m ² z kamínka	m ²	71,40	31,344	0,00	0,00	2 237,86	31,34	0,00	
2	K	113107241	Očištění postelů p. přes 200 m ² železných II 50 mm	m ²	23,80	31,344	0,00	0,00	746,99	31,34	0,00	
3	K	113151214	Očištění železných kůly železných p. přes 500 m ² (II 50 mm bez přídavků v trasa z mateřským	m ²	107,10	3 355,94	0,00	0,00	3 355,94	31,34	0,00	
4	K	115001422	Dokazná zajištění kabelů z kabelových trati z 6 vodičů	m	0,800	398,68	0,00	0,00	317,34	0,80	0,00	
5	K	121101103	Čištění šablů	m ³	23,820	55,20	0,00	0,00	2 724,62	26,62	0,00	
6	K	130001101	Správa omoc s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m ³	2,550	418,51	0,00	0,00	1 066,27	2,55	0,00	
7	K	132101204	Převážka ze střížní výkopky v blízkosti pozemního pásu 5000 m ³	m ³	418,51	63,634	0,00	0,00	63,63	418,51	0,00	
8	K	132201204	Hrobovní ořh 4 do 2000 mm v hornině II, 1 a 2 objemu přes 5000 m ³	m ³	418,51	17 695,85	0,00	0,00	42,46	418,51	0,00	
9	K	132301204	Hrobovní ořh 4 do 2000 mm v hornině II, 4 objemu přes 5000 m ³	m ³	476,01	15 159,49	0,00	0,00	31,85	476,01	0,00	
10	K	132401201	Hrobovní ořh 1 do 2000 mm v hornině II, 5	m ³	476,01	15 159,49	0,00	0,00	31,85	476,01	0,00	
11	K	132501201	Hrobovní ořh 4 do 2000 mm v hornině II, 6	m ³	533,51	22 738,83	0,00	0,00	42,46	533,51	0,00	
12	K	151101101	Zřízení příložkové palení a ošetření stěn ořh hl do 2 m	m ²	602,469	28 678,81	0,00	0,00	602,50	602,50	0,00	
13	K	151101111	Očištění příložkové palení a ošetření stěn ořh hl do 2 m	m ²	602,469	28 678,81	0,00	0,00	602,50	602,50	0,00	
14	K	161101101	Svára přemístění výkopky z horniny II 1 až 4 hl výkopu přes 2,5 m	m ³	138,003	101,16	0,00	0,00	74,31	138,00	0,00	
15	K	161101151	Svára přemístění výkopky z horniny II 5 až 7 hl výkopu přes 2,5 m	m ³	74,309	101,16	0,00	0,00	74,31	74,31	0,00	
16	K	162701155	Výkopové přemístění do 10000 m výkopky z horniny II 5 až 7	m ³	74,309	238,01	0,00	0,00	74,31	74,31	0,00	
17	K	162701159	Výkopové přemístění do 10000 m výkopky z horniny II 5 až 7	m ³	891,708	28 757,58	0,00	0,00	891,71	891,71	0,00	
18	K	167101152	Nákladní výkopky z horniny II 5 až 7 přes 100 m ³	m ³	74,309	4 842,77	0,00	0,00	74,31	74,31	0,00	
19	K	171201201	Uložení sypaviny na skládce	m ³	74,309	35 371,83	0,00	0,00	118,89	74,31	0,00	
20	K	171201211	Převážka ze skládky odpadů se sypaviny na skládce (síl. 400 mm)	t	286,131	286,131	0,00	0,00	118,89	286,13	0,00	
21	K	174101101	4,30x21,6 Převážka do 10000 m výkopky z horniny II 5 až 7	m ³	137,238	130,90	0,00	0,00	137,24	137,24	0,00	
22	K	174101101	Ořh polní bez probíhání sypaviny z horniny II 1 až 4	m ³	60,010	281,81	0,00	0,00	60,01	60,01	0,00	
23	M	193373020	Získání písku 0,6	t	772,218	297,51	0,00	0,00	112,22	772,22	0,00	
24	K	160402111	Čištění a údržba stávkou výškovým v rovně a vs	m ²	288,200	1 705,75	0,00	0,00	288,20	288,20	0,00	
25	M	002727020	Autovazební omoc II v trase do 100 mm p. přes 500 m ²	m ²	15,026	178,50	0,00	0,00	15,03	15,03	0,00	
26	K	161301111	Čištění polí napojením na tloušťku do 0,1 m v rovně, nebo ve výšce do 1,5	m ²	286,200	118,00	0,00	0,00	286,20	286,20	0,00	
27	K	163402311	Očištění stávkou napojením na tloušťku do 0,1 m v rovně a vs	m ²	288,200	17,86	0,00	0,00	288,20	288,20	0,00	
28	K	163603111	Očištění stávkou napojením v rovně a vs do 1,5	m ²	288,200	5,56	0,00	0,00	288,20	288,20	0,00	
29	K	163904312	Zřízení vodní pobočky přes 20 m ²	m ³	28 620	119,00	0,00	0,00	28,62	28,62	0,00	
D 4 Vodovodné konstrukce												
30	K	451573111	Lože pod polní el. výškový výkop ze střížepisky	m ³	15,052	1 154,32	0,00	0,00	15,06	15,06	0,00	
D 5 Koprunkace												
31	K	594251111	Prostředek nebo podstava ze střížepisky Sp II 150 mm	m ²	31,344	209,26	0,00	0,00	31,34	31,34	0,00	
32	K	594251111	Prostředek z kamínka hrubého čístečného Vkl. 32-63 mm (II 150 mm)	m ²	62,688	208,26	0,00	0,00	62,69	62,69	0,00	
33	K	577144111	Autovazební omoc II v trase do 100 mm p. přes 500 m ²	m ²	31,344	334,46	0,00	0,00	31,34	31,34	0,00	
34	K	1571145112	Autovazební omoc II v trase do 100 mm p. přes 500 m ²	m ²	31,344	391,71	0,00	0,00	31,34	31,34	0,00	
D 6 Tlakové sítě												
35	K	163724121	Montáž tlakových hadovek vodovodných přírubových ústřední výšky DN 80	kus	3,000	773,52	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	
36	M	552516844	Příruha tlaková DN60 2000 DSD00N 60 PN 10	kus	3,000	6 817,41	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	
37	K	167116112	Montáž potrubí z tlakové tlakové polyethylenové výšky svařovacími spoji průměr 32 mm	m	6,000	337,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	
38	M	260195660	potrubí vodovodní ROBUST PIPE FPE 100+, SDR 11, 32 x 3,0 mm	m	6,000	35,70	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	
39	K	167124121	Montáž potrubí z tlakové tlakové polyethylenové výšky svařovacími spoji průměr 50 mm	m	182,280	107,10	0,00	0,00	182,28	182,28	0,00	
40	M	260196270	potrubí tlakové ROBUST PIPE FPE 100+, SDR 11, 50 x 3,0 mm	m	185,014	264,23	0,00	0,00	185,01	185,01	0,00	
41	K	167241121	Montáž odvětvové potrubí z tlakové tlakové polyethylenové výšky svařovacími spoji průměr 50 mm	kus	13,000	53,56	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00	
42	M	260110181	PE odvětvový výškový přírubový průměr 50 mm	kus	3,045	208,65	0,00	0,00	3,05	3,05	0,00	
43	M	286335981	tlakové odvětvové odvětvové příruhy EFL DN60 DN 60 tlakové odvětvové příruhy s přírubou EFL DN60 DN 60	kus	6,090	2 387,20	0,00	0,00	6,09	6,09	0,00	

Číslo	Popis	M	6,000	59,50	35,00	U ₁	U ₂	U ₃	U ₄	U ₅	U ₆	U ₇	U ₈	U ₉	U ₁₀	U ₁₁	U ₁₂	U ₁₃	U ₁₄	U ₁₅	U ₁₆	U ₁₇	U ₁₈	U ₁₉	U ₂₀	U ₂₁	U ₂₂	U ₂₃	U ₂₄	U ₂₅	U ₂₆	U ₂₇	U ₂₈	U ₂₉	U ₃₀	U ₃₁	U ₃₂	U ₃₃	U ₃₄	U ₃₅	U ₃₆	U ₃₇	U ₃₈	U ₃₉	U ₄₀	U ₄₁	U ₄₂	U ₄₃	U ₄₄	U ₄₅	U ₄₆	U ₄₇	U ₄₈	U ₄₉	U ₅₀	U ₅₁	U ₅₂	U ₅₃	U ₅₄	U ₅₅	U ₅₆	U ₅₇	U ₅₈	U ₅₉	U ₆₀	U ₆₁	U ₆₂	U ₆₃	U ₆₄	U ₆₅	U ₆₆	U ₆₇	U ₆₈	U ₆₉	U ₇₀	U ₇₁	U ₇₂	U ₇₃	U ₇₄	U ₇₅	U ₇₆	U ₇₇	U ₇₈	U ₇₉	U ₈₀	U ₈₁	U ₈₂	U ₈₃	U ₈₄	U ₈₅	U ₈₆	U ₈₇	U ₈₈	U ₈₉	U ₉₀	U ₉₁	U ₉₂	U ₉₃	U ₉₄	U ₉₅	U ₉₆	U ₉₇	U ₉₈	U ₉₉	U ₁₀₀	U ₁₀₁	U ₁₀₂	U ₁₀₃	U ₁₀₄	U ₁₀₅	U ₁₀₆	U ₁₀₇	U ₁₀₈	U ₁₀₉	U ₁₁₀	U ₁₁₁	U ₁₁₂	U ₁₁₃	U ₁₁₄	U ₁₁₅	U ₁₁₆	U ₁₁₇	U ₁₁₈	U ₁₁₉	U ₁₂₀	U ₁₂₁	U ₁₂₂	U ₁₂₃	U ₁₂₄	U ₁₂₅	U ₁₂₆	U ₁₂₇	U ₁₂₈	U ₁₂₉	U ₁₃₀	U ₁₃₁	U ₁₃₂	U ₁₃₃	U ₁₃₄	U ₁₃₅	U ₁₃₆	U ₁₃₇	U ₁₃₈	U ₁₃₉	U ₁₄₀	U ₁₄₁	U ₁₄₂	U ₁₄₃	U ₁₄₄	U ₁₄₅	U ₁₄₆	U ₁₄₇	U ₁₄₈	U ₁₄₉	U ₁₅₀	U ₁₅₁	U ₁₅₂	U ₁₅₃	U ₁₅₄	U ₁₅₅	U ₁₅₆	U ₁₅₇	U ₁₅₈	U ₁₅₉	U ₁₆₀	U ₁₆₁	U ₁₆₂	U ₁₆₃	U ₁₆₄	U ₁₆₅	U ₁₆₆	U ₁₆₇	U ₁₆₈	U ₁₆₉	U ₁₇₀	U ₁₇₁	U ₁₇₂	U ₁₇₃	U ₁₇₄	U ₁₇₅	U ₁₇₆	U ₁₇₇	U ₁₇₈	U ₁₇₉	U ₁₈₀	U ₁₈₁	U ₁₈₂	U ₁₈₃	U ₁₈₄	U ₁₈₅	U ₁₈₆	U ₁₈₇	U ₁₈₈	U ₁₈₉	U ₁₉₀	U ₁₉₁	U ₁₉₂	U ₁₉₃	U ₁₉₄	U ₁₉₅	U ₁₉₆	U ₁₉₇	U ₁₉₈	U ₁₉₉	U ₂₀₀	U ₂₀₁	U ₂₀₂	U ₂₀₃	U ₂₀₄	U ₂₀₅	U ₂₀₆	U ₂₀₇	U ₂₀₈	U ₂₀₉	U ₂₁₀	U ₂₁₁	U ₂₁₂	U ₂₁₃	U ₂₁₄	U ₂₁₅	U ₂₁₆	U ₂₁₇	U ₂₁₈	U ₂₁₉	U ₂₂₀	U ₂₂₁	U ₂₂₂	U ₂₂₃	U ₂₂₄	U ₂₂₅	U ₂₂₆	U ₂₂₇	U ₂₂₈	U ₂₂₉	U ₂₃₀	U ₂₃₁	U ₂₃₂	U ₂₃₃	U ₂₃₄	U ₂₃₅	U ₂₃₆	U ₂₃₇	U ₂₃₈	U ₂₃₉	U ₂₄₀	U ₂₄₁	U ₂₄₂	U ₂₄₃	U ₂₄₄	U ₂₄₅	U ₂₄₆	U ₂₄₇	U ₂₄₈	U ₂₄₉	U ₂₅₀	U ₂₅₁	U ₂₅₂	U ₂₅₃	U ₂₅₄	U ₂₅₅	U ₂₅₆	U ₂₅₇	U ₂₅₈	U ₂₅₉	U ₂₆₀	U ₂₆₁	U ₂₆₂	U ₂₆₃	U ₂₆₄	U ₂₆₅	U ₂₆₆	U ₂₆₇	U ₂₆₈	U ₂₆₉	U ₂₇₀	U ₂₇₁	U ₂₇₂	U ₂₇₃	U ₂₇₄	U ₂₇₅	U ₂₇₆	U ₂₇₇	U ₂₇₈	U ₂₇₉	U ₂₈₀	U ₂₈₁	U ₂₈₂	U ₂₈₃	U ₂₈₄	U ₂₈₅	U ₂₈₆	U ₂₈₇	U ₂₈₈	U ₂₈₉	U ₂₉₀	U ₂₉₁	U ₂₉₂	U ₂₉₃	U ₂₉₄	U ₂₉₅	U ₂₉₆	U ₂₉₇	U ₂₉₈	U ₂₉₉	U ₃₀₀	U ₃₀₁	U ₃₀₂	U ₃₀₃	U ₃₀₄	U ₃₀₅	U ₃₀₆	U ₃₀₇	U ₃₀₈	U ₃₀₉	U ₃₁₀	U ₃₁₁	U ₃₁₂	U ₃₁₃	U ₃₁₄	U ₃₁₅	U ₃₁₆	U ₃₁₇	U ₃₁₈	U ₃₁₉	U ₃₂₀	U ₃₂₁	U ₃₂₂	U ₃₂₃	U ₃₂₄	U ₃₂₅	U ₃₂₆	U ₃₂₇	U ₃₂₈	U ₃₂₉	U ₃₃₀	U ₃₃₁	U ₃₃₂	U ₃₃₃	U ₃₃₄	U ₃₃₅	U ₃₃₆	U ₃₃₇	U ₃₃₈	U ₃₃₉	U ₃₄₀	U ₃₄₁	U ₃₄₂	U ₃₄₃	U ₃₄₄	U ₃₄₅	U ₃₄₆	U ₃₄₇	U ₃₄₈	U ₃₄₉	U ₃₅₀	U ₃₅₁	U ₃₅₂	U ₃₅₃	U ₃₅₄	U ₃₅₅	U ₃₅₆	U ₃₅₇	U ₃₅₈	U ₃₅₉	U ₃₆₀	U ₃₆₁	U ₃₆₂	U ₃₆₃	U ₃₆₄	U ₃₆₅	U ₃₆₆	U ₃₆₇	U ₃₆₈	U ₃₆₉	U ₃₇₀	U ₃₇₁	U ₃₇₂	U ₃₇₃	U ₃₇₄	U ₃₇₅	U ₃₇₆	U ₃₇₇	U ₃₇₈	U ₃₇₉	U ₃₈₀	U ₃₈₁	U ₃₈₂	U ₃₈₃	U ₃₈₄	U ₃₈₅	U ₃₈₆	U ₃₈₇	U ₃₈₈	U ₃₈₉	U ₃₉₀	U ₃₉₁	U ₃₉₂	U ₃₉₃	U ₃₉₄	U ₃₉₅	U ₃₉₆	U ₃₉₇	U ₃₉₈	U ₃₉₉	U ₄₀₀	U ₄₀₁	U ₄₀₂	U ₄₀₃	U ₄₀₄	U ₄₀₅	U ₄₀₆	U ₄₀₇	U ₄₀₈	U ₄₀₉	U ₄₁₀	U ₄₁₁	U ₄₁₂	U ₄₁₃	U ₄₁₄	U ₄₁₅	U ₄₁₆	U ₄₁₇	U ₄₁₈	U ₄₁₉	U ₄₂₀	U ₄₂₁	U ₄₂₂	U ₄₂₃	U ₄₂₄	U ₄₂₅	U ₄₂₆	U ₄₂₇	U ₄₂₈	U ₄₂₉	U ₄₃₀	U ₄₃₁	U ₄₃₂	U ₄₃₃	U ₄₃₄	U ₄₃₅	U ₄₃₆	U ₄₃₇	U ₄₃₈	U ₄₃₉	U ₄₄₀	U ₄₄₁	U ₄₄₂	U ₄₄₃	U ₄₄₄	U ₄₄₅	U ₄₄₆	U ₄₄₇	U ₄₄₈	U ₄₄₉	U ₄₅₀	U ₄₅₁	U ₄₅₂	U ₄₅₃	U ₄₅₄	U ₄₅₅	U ₄₅₆	U ₄₅₇	U ₄₅₈	U ₄₅₉	U ₄₆₀	U ₄₆₁	U ₄₆₂	U ₄₆₃	U ₄₆₄	U ₄₆₅	U ₄₆₆	U ₄₆₇	U ₄₆₈	U ₄₆₉	U ₄₇₀	U ₄₇₁	U ₄₇₂	U ₄₇₃	U ₄₇₄	U ₄₇₅	U ₄₇₆	U ₄₇₇	U ₄₇₈	U ₄₇₉	U ₄₈₀	U ₄₈₁	U ₄₈₂	U ₄₈₃	U ₄₈₄	U ₄₈₅	U ₄₈₆	U ₄₈₇	U ₄₈₈	U ₄₈₉	U ₄₉₀	U ₄₉₁	U ₄₉₂	U ₄₉₃	U ₄₉₄	U ₄₉₅	U ₄₉₆	U ₄₉₇	U ₄₉₈	U ₄₉₉	U ₅₀₀	U ₅₀₁	U ₅₀₂	U ₅₀₃	U ₅₀₄	U ₅₀₅	U ₅₀₆	U ₅₀₇	U ₅₀₈	U ₅₀₉	U ₅₁₀	U ₅₁₁	U ₅₁₂	U ₅₁₃	U ₅₁₄	U ₅₁₅	U ₅₁₆	U ₅₁₇	U ₅₁₈	U ₅₁₉	U ₅₂₀	U ₅₂₁	U ₅₂₂	U ₅₂₃	U ₅₂₄	U ₅₂₅	U ₅₂₆	U ₅₂₇	U ₅₂₈	U ₅₂₉	U ₅₃₀	U ₅₃₁	U ₅₃₂	U ₅₃₃	U ₅₃₄	U ₅₃₅	U ₅₃₆	U ₅₃₇	U ₅₃₈	U ₅₃₉	U ₅₄₀	U ₅₄₁	U ₅₄₂	U ₅₄₃	U ₅₄₄	U ₅₄₅	U ₅₄₆	U ₅₄₇	U ₅₄₈	U ₅₄₉	U ₅₅₀	U ₅₅₁	U ₅₅₂	U ₅₅₃	U ₅₅₄	U ₅₅₅	U ₅₅₆	U ₅₅₇	U ₅₅₈	U ₅₅₉	U ₅₆₀	U ₅₆₁	U ₅₆₂	U ₅₆₃	U ₅₆₄	U ₅₆₅	U ₅₆₆	U ₅₆₇	U ₅₆₈	U ₅₆₉	U ₅₇₀	U ₅₇₁	U ₅₇₂	U ₅₇₃	U ₅₇₄	U ₅₇₅	U ₅₇₆	U ₅₇₇	U ₅₇₈	U ₅₇₉	U ₅₈₀	U ₅₈₁	U ₅₈₂	U ₅₈₃	U ₅₈₄	U ₅₈₅	U ₅₈₆	U ₅₈₇	U ₅₈₈	U ₅₈₉	U ₅₉₀	U ₅₉₁	U ₅₉₂	U ₅₉₃	U ₅₉₄	U ₅₉₅	U ₅₉₆	U ₅₉₇	U ₅₉₈	U ₅₉₉	U ₆₀₀	U ₆₀₁	U ₆₀₂	U ₆₀₃	U ₆₀₄	U ₆₀₅	U ₆₀₆	U ₆₀₇	U ₆₀₈	U ₆₀₉	U ₆₁₀	U ₆₁₁	U ₆₁₂	U ₆₁₃	U ₆₁₄	U ₆₁₅	U ₆₁₆	U ₆₁₇	U ₆₁₈	U ₆₁₉	U ₆₂₀	U ₆₂₁	U ₆₂₂	U ₆₂₃	U ₆₂₄	U ₆₂₅	U ₆₂₆	U ₆₂₇	U ₆₂₈	U ₆₂₉	U ₆₃₀	U ₆₃₁	U ₆₃₂	U ₆₃₃	U ₆₃₄	U ₆₃₅	U ₆₃₆	U ₆₃₇	U ₆₃₈	U ₆₃₉	U ₆₄₀	U ₆₄₁	U ₆₄₂	U ₆₄₃	U ₆₄₄	U ₆₄₅	U ₆₄₆	U ₆₄₇	U ₆₄₈	U ₆₄₉	U ₆₅₀	U ₆₅₁	U ₆₅₂	U ₆₅₃	U ₆₅₄	U ₆₅₅	U ₆₅₆	U ₆₅₇	U ₆₅₈	U ₆₅₉	U ₆₆₀	U ₆₆₁	U ₆₆₂	U ₆₆₃	U ₆₆₄	U ₆₆₅	U ₆₆₆	U ₆₆₇	U ₆₆₈	U ₆₆₉	U ₆₇₀	U ₆₇₁	U ₆₇₂	U ₆₇₃	U ₆₇₄	U ₆₇₅	U ₆₇₆	U ₆₇₇	U ₆₇₈	U ₆₇₉	U ₆₈₀	U ₆₈₁	U ₆₈₂	U ₆₈₃	U ₆₈₄	U ₆₈₅	U ₆₈₆	U ₆₈₇	U ₆₈₈	U ₆₈₉	U ₆₉₀	U ₆₉₁	U ₆₉₂	U ₆₉₃	U ₆₉₄	U ₆₉₅	U ₆₉₆	U ₆₉₇	U ₆₉₈	U ₆₉₉	U ₇₀₀	U ₇₀₁	U ₇₀₂	U ₇₀₃	U ₇₀₄	U ₇₀₅	U ₇₀₆	U ₇₀₇	U ₇₀₈	U ₇₀₉	U ₇₁₀	U ₇₁₁	U ₇₁₂	U ₇₁₃	U ₇₁₄	U ₇₁₅	U ₇₁₆	U ₇₁₇	U ₇₁₈	U ₇₁₉	U ₇₂₀	U ₇₂₁	U ₇₂₂	U ₇₂₃	U ₇₂₄	U ₇₂₅	U ₇₂₆	U ₇₂₇	U ₇₂₈	U ₇₂₉	U ₇₃₀	U ₇₃₁	U ₇₃₂	U ₇₃₃	U ₇₃₄	U ₇₃₅	U ₇₃₆	U ₇₃₇	U ₇₃₈	U ₇₃₉	U ₇₄₀	U ₇₄₁	U ₇₄₂	U ₇₄₃	U ₇₄₄	U ₇₄₅	U ₇₄₆	U ₇₄₇	U ₇₄₈	U ₇₄₉	U ₇₅₀	U ₇₅₁	U ₇₅₂	U ₇₅₃	U ₇₅₄	U ₇₅₅	U ₇₅₆	U ₇₅₇	U ₇₅₈	U ₇₅₉	U ₇₆₀	U ₇₆₁	U ₇₆₂	U ₇₆₃	U ₇₆₄	U ₇₆₅	U ₇₆₆	U ₇₆₇	U ₇₆₈	U ₇₆₉	U ₇₇₀	U ₇₇₁	U ₇₇₂	U ₇₇₃	U ₇₇₄	U ₇₇₅	U ₇₇₆	U ₇₇₇	U ₇₇₈	U ₇₇₉	U ₇₈₀	U ₇₈₁	U ₇₈₂	U ₇₈₃	U ₇₈₄	U ₇₈₅	U ₇₈₆	U ₇₈₇	U ₇₈₈	U ₇₈₉	U ₇₉₀	U ₇₉₁	U ₇₉₂	U ₇₉₃	U ₇₉₄	U ₇₉₅	U ₇₉₆	U ₇₉₇	U ₇₉₈	U ₇₉₉	U ₈₀₀	U ₈₀₁	U ₈₀₂	U ₈₀₃	U ₈₀₄	U ₈₀₅	U ₈₀₆	U ₈₀₇	U ₈₀₈	U ₈₀₉	U ₈₁₀	U ₈₁₁	U ₈₁₂	U ₈₁₃	U ₈₁₄	U ₈₁₅	U ₈₁₆	U ₈₁₇	U ₈₁₈	U ₈₁₉	U ₈₂₀	U ₈₂₁	U ₈₂₂	U ₈₂₃	U ₈₂₄	U ₈₂₅	U ₈₂₆	U
-------	-------	---	-------	-------	-------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	---

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dostavba kanalizace v místní části Maa Bělá, neuzatčená rakličky
 Občerst: 02 - SO 09 - Oprava komunikace SUS

Město: 18.3.2019
 Datum: 18.3.2019
 Projektant: Město Bakov nad Jizerou
 Zpracovatel: Vojtěch Ušák
 Projekt: VWS a s
 Popis: Město Bakov nad Jizerou
 Měřítko: 1:100000
 Projektový koeficient: 0,00000

PC	Typ	Kód	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Nakládky soupisu celkem							
D	HSV					5 657 890,16	
D	HSV					5 657 890,16	
D	1	K	10151214	Zemní práce	9 701,200	1 038 998,52	
						1 038 998,52	
D	5	K	977144121	Komunikace	9 701,200	3 244 663,35	
						3 244 663,35	
						1 374 228,29	
D	9	K	919731121	Odstavení konstrukce a práce bourání	3 456,600	28,92	
						103 421,47	
						3 456,600	
						103 421,47	
						35,70	
						44 330,62	
						14 501,048	
						531 957,41	
						1 241,754	
						531 087,32	

Doplňkový rozpis		ROZDIL V L ÚN	SKUTEČNOST	Z001 vodovod	Z002 ČSOV 3	Z007 komunikace	Z008 neopracované práce
Domélníkový rozpis	ROZDIL V L ÚN	SKUTEČNOST	méněpráce	méněpráce	méněpráce	méněpráce	méněpráce
0,00	-2 143 129,08	3 514 781,09	0,00	0,00	-2 342 336,60	199 207,53	0,00
0,00	0,00	9 701,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 038 998,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2 133 493,61	3 316,30	1 099 169,70	0,00	6 884,9	2135693,65	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 458,6	103421,47	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 458,6	103421,47	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241,75	44 330,62	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 501,05	531 957,41	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241,75	531 087,32	0,00
3 316,30	55 548,03	3 316,30	55 548,03	0,00	0,00	3 316,3	55 548,03
14,00	28 180,00	14,00	28 180,00	0,00	0,00	14	28 180
6,00	6 300,00	6,00	6 300,00	0,00	0,00	6	6 300
368,00	18 652,00	368,00	18 652,00	0,00	0,00	368	18 652
328,30	91 354,00	328,30	91 354,00	0,00	0,00	328,3	91 354
5,50	863,50	5,50	863,50	0,00	0,00	5,5	863,5

POLOŽKY NAD RAMEC SOU		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
001	13201109	M2	18,75	18,75	18,75
002	5033111	M2	180,00	180,00	180,00
003	2493111	M2	1 050,00	1 050,00	1 050,00
004	5087115	M2	515	515	515
005	9714111	M2	290	290	290
007	1133084	M2	197	197	197

ZL 014 Doměrkový rozpočet_ Malá Bělá**2 418 038,41**

Malá Bělá - nn, méněpráce	224 709,87	Malá Bělá - uz, vícepráce	2 193 328,54
01 - SO 03 - Přeložky vodovodu	224 709,87	01 - SO 01 - Gravitační kanalizace	-387 671,32
02 - SO 09 - Oprava komunikace SÚS	0,00	02 - SO 02 - Tlaková kanalizace	-64 064,63
03 - VRN	0,00	03 - SO 04 - Kanalizační přípojky	2 645 064,49



ZMĚNOVÝ LIST č. 015

ev projektu: Odkanalizování obcí v povodí Jizery
o projektu: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007096

Objednatel: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Čechova 1151 293 22 Mladá Boleslav	Změnový list číslo: 015
Zhotovitel: Sdružení Odkanalizování obcí v povodí Jizery, část C; společnost Selská 517 460 01 Liberec XII	Datum vydání:
Správce stavby: Sdružení „Garnets – Realstav MB“ Garnets Consulting a.s. Československých legií 445/4 415 01 Teplice	Číslo smlouvy:

Název pod-projektu
SO/PS dotčené změnou:

Odkanalizování obcí v povodí Jizery – část C
02) Hrdlořezy, výstavba kanalizace
Neuznatelné náklady stavby: SO 01.1. – Stoka A, SO 01.3. – Stoka AC, SO 01.12. – Stoka B, SO 01.15 – Stoka C-1

Stručný popis změny:

Na základě požadavku obce bude provedena oprava místních komunikací po stavbě kanalizace v rýze i ve zbývající ploše komunikace metodou studené recyklace. Obec opravu místní komunikace mimo plochu obsaženou ve výkresové dokumentaci projektu uhradí objednateli díla.

Popis změny, technického řešení:

- Při opravě místních komunikací dotčených stavbou bude změněna skladba konstrukčního souvrství v rýhách za technologii recyklace za studena s použitím cementu a dalších speciálních pojiv. Recyklace je prováděna strojně a v místě šachet a dalších poklopů ručně až do hloubky 450 mm. Změna je prováděna na základě požadavku obce, která chce opravit touto technologií místní komunikace v celé ploše. Obnovu místních komunikací dotčených stavbou v plochách mimo plochy stanovené v zadávací dokumentaci technologií recyklací za studena uhradí obec.

Původní řešení dle smluvní (zadávací dokumentace):

- Opravy ploch místních komunikací mimo výkopové rýhy po stavbě kanalizace nebyly v zadávací dokumentaci řešeny.

ZMĚNOVÝ LIST č. 015

Název projektu: Odkanalizování obcí v povodí Jizery
 Číslo projektu: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007096


Nové řešení:	
Dojde k obnově komunikací pomocí recyklace za studena v tomto rozsahu	
- SO 01.1. – Stoka A	1465,61 m ²
- SO 01.12 – Stoka B	118,84 m ²
- SO 01.15 – Stoka C-1	1 180,70 m ²
Rozšíření obrusné vrstvy	
- SO 01.1. – Stoka A	710,43 m ²
- SO 01.12 – Stoka B	113,18 m ²
- SO 01.3. – Stoka AC	2 792,3 m ²
- SO 01.15 – Stoka C-1	645,16 m ²
Kladení dlažby	
- SO 01.15 – Stoka C-1	23,75 m ²
Zdůvodnění změny:	
- Na základě požadavku obce dojde k opravě komunikace i mimo výkopy po stavbě kanalizace.	
Z hlediska ZZVZ jde o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222, odst. 5	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:	
a) zadávací dokumentace	ne
b) realizační (dílešná) dokumentace zhotovitele:	změna bude zapracována do DSPS
c) výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	není nutné zpracovávat
Předpokládaný vliv na:	
a) termín	ne
b) kvalitu	ne
c) cenu díla	ano


Náklady na změnu	Zvýšení nákladů se bude týkat pouze nezpůsobilých nákladů projektu			
	Vícepráce nezpůsobilé		Méněpráce	
	bez DPH	včetně DPH	bez DPH	včetně DPH
stavební náklady nezpůsobilé	4 440 407,91 Kč	5 372 893,58 Kč	-147 396,42 Kč	-178 349,67 Kč
způsobilé	0,- Kč	0,- Kč	-1 170 236,35 Kč	-1 415 985,98 Kč
projekční náklady	0,- Kč	0,- Kč	0,- Kč	0,- Kč
celkem ZL č. 015 bez DPH	3 122 775,14 Kč			
celkem ZL č. 015 vč. DPH	3 778 557,93 Kč			


Změnu navrhuje:	Objednatel
------------------------	-------------------


ZMĚNOVÝ LIST č. 015

Název projektu: Odkanalizování obcí v povodí Jizery
Číslo projektu: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007096

Souhlas zhotovitele:	Zhotovitel se změnou souhlasí
Datum: 29.07.2022	
Jméno odpovědné osoby zhotovitele:	Ing. Martin Matzner
Podpis:	 Ještěbská stavební společnost spol. s r.o. Razítko: Selská 517, 460 01 Liberec XII - Staré Pavlovice IČ: 10302350 DIČ: CZ19302550

Souhlas projektanta:	Projektant se změnou souhlasí
Datum:	
Jméno odpovědné osoby projektanta:	Ing. Roman Bárta
Podpis: 	Razítko: ŠINDLAR s.r.o. Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové tel.: 495 402 560 • www.sindlar.cz IČ: 260 03 236, DIČ: CZ26003236 -07-

Souhlas a vyjádření správce stavby:	Správce stavby se změnou souhlasí
Datum:	
Jméno odpovědné osoby správce stavby:	p. Jiří Bouma
Podpis: 	Razítko: SPRÁVCE STAVBY Sdružení „Garnets - Realstav MB“ Garnets Consulting a.s. Realstav MB, spol. s r.o. Odkanalizování obcí v povodí Jizery

Souhlas objednatele:	Objednatel se změnou souhlasí
Datum: 29.7.2022	
Jméno odpovědné osoby objednatele:	Ing. Tomáš Žitný 
Podpis:	Razítko: VODOVODY A KANALIZACE MLADÁ BOLESLAV, a.s. Čechova 1151 293 22 Mladá Boleslav 88

Přílohy změnového listu:

1) Položkový rozpočet

Poznámka:



3 = 1156m²

2 = 1035m²

1 = 750m²

OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ:

Na základě smlouvy uzavřené s obcí Hrdlořezy (Smlouva o spolupráci při realizaci stavby xxxxxxxx) byly provedeny opravy MK v jiném rozsahu, nežli uvažovala zadávací dokumentace, a došlo tak ke zvětšení rozsahu plnění zhotovitele. Některé komunikace byly po výstavbě kanalizace a vodovodu opraveny celoplošnou metodou studené recyklace Power Cem s krycí vrstvou ACO tl. 50 mm. Na místní komunikaci byly realizovány retardéry ze žulových kostek. Zvýšené náklady na opavy komunikací hradila obec Hrdlořezy. Celoplošně byly opraveny Místní komunikace nad těmito stokami:

VÝMĚRY ŘEŠENY V RÁMCI VaK (kanalizace / vodovod)						
		VÝMĚRY (PODKLADNÍ VRSTVY RS)		VÝMĚRA (OBRUSNÉ VRSTVY)		VÝMĚRY (KLADENÍ DLAŽBY)
SO 01.10. / SO 08.5., SO 08.6.	Stoka AG / vodovod AG-a, AG-b	663,50		631,90		
SO 01.12.	Stoka B	403,88		384,65		
SO 01.15. / SO 08.7.	Stoka C-1 / vodovod C-1-a	639,00		580,00		
SO 01.18.	Stoka C-2	459,74		437,85		
SO 01.19. / SO04.1., SO 08.4.	Stoka D / Výtlačný řad V3 / Přeložka AE-a	733,95		699,00		
SO 01.20. / SO 05.1. / 03 - SO 07	Stoka E / Výtlačný řad V4 / KP	576,94		545,26		
SO 01.21.	Stoka E-1	100,97		124,27		
SO 01.22. / SO 06.1.	Stoka F / Výtlačný řad V5	131,25		125,00		
		3 709,23	M2	3 527,93	M2	

POŽADAVEK NA CELKOVOU REKONSTRUKCI MK:

6 970,21 M2

7 087,52 M2

23,10 M2

K DOFINANCOVÁNÍ OBEC HRDLŮŘEZY:

		VÝMĚRY (PODKLADNÍ VRSTVY RS)		VÝMĚRA (OBRUSNÉ VRSTVY)		VÝMĚRY (KLADENÍ DLAŽBY)
SO 01.1.	Stoka A	1475,61		1383,33		
SO 01.3.	Stoka AC					
SO 01.12.	Stoka B	118,84		113,18		
SO 01.15. / SO 08.7.	Stoka C-1 / vodovod C-1-a	718,06		1207,80		23,1
SO 01.18.	Stoka C-2	204,91		195,15		
SO 01.20. / SO 05.1. / 03 - SO 07	Stoka E / Výtlačný řad V4 / KP	52,56		34,55		
SO 01.21.	Stoka E-1	476,80		421,58		
SO 01.22. / SO 06.1.	Stoka F / Výtlačný řad V5	214,20		204,00		
		3 260,98	M2	3559,59	M2	23,10 M2

Z100_Hrdlořezy - Změna skladby asfaltové komunikace MK				3 122 775,15
Hrdlořezy - neuznatelné		4 293 011,49	Hrdlořezy - uznatelné	
Hrdlořezy - neuznatelné		4 440 407,91	Hrdlořezy - uz	
Hrdlořezy - neuznatelné	Hrdlořezy - neuznatelné	Hrdlořezy - neuzatelné	Hrdlořezy - uz méněpr	Hrdlořezy - uz vícepr
Hrdlořezy - neuz méněpr	-147 396,42	Hrdlořezy - neuz vícepr	4 440 407,91	0,00
SO 08.7. - Přeložka vodovodu C-1-a	-147 396,42	SO 08.7. - Přeložka vodovodu C-1-a		
		SO 01.1. - Stoka A	1 111 702,96	
		SO 01.3. - Stoka AC	1 544 185,49	
		SO 01.12. - Stoka B	161 589,28	
		SO 01.15. - Stoka C-1	1 622 930,18	
Hrdlořezy - méněpráce	-1 317 632,76			
Hrdlořezy - vícepráce	4 440 407,91			
Infrační navýšení ceny prací v roce 2022				
				855 955,13
				1 053 243,24
				-30 699,62
				119 189,22
				1 272 483,60
				-147 396,42
				3 122 775,15

0,16
507 794,47
3 630 569,62
762 419,62
4 392 989,24

Konečná cena oprav komunikací pro obec přic
DPH 21%
Celkem



ZMĚNOVÝ LIST č. 016

ev projektu:

Odkanalizování obcí v povodí Jizery

projektu:

CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007096

Objednatel: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Čechova 1151 293 22 Mladá Boleslav	Změnový list číslo:	016
Zhotovitel: Sdružení Odkanalizování obcí v povodí Jizery, část C; společnost Selská 517 460 01 Liberec XII	Datum vydání:	
Správce stavby: Sdružení „Garnets – Realstav MB“ Garnets Consulting a.s. Československých legií 445/4 415 01 Teplice	Číslo smlouvy:	

**Název pod-projektu
SO/PS dotčené změnou:**

Odkanalizování obcí v povodí Jizery – část C
06) Malá Bělá, výstavba kanalizace
Náklady stavby: gravitační kanalizace

Stručný popis změny:

Na základě požadavku obce bude provedena oprava místních komunikací po stavbě kanalizace v rýze i ve zbývající ploše komunikace metodou studené recyklace. Obec opravu místní komunikace mimo plochu obsaženou ve výkresové dokumentaci projektu uhradí objednateli díla.

Popis změny, technického řešení:

- Při opravě místních komunikací dotčených stavbou bude změněna skladba konstrukčního souvrství v rýhách za technologii recyklace za studena s použitím cementu a dalších speciálních pojiv. Recyklace je prováděna strojně a v místě šachet a dalších poklopů ručně až do hloubky 450 mm. Změna je prováděna na základě požadavku obce, která chce opravit touto technologií místní komunikace v celé ploše a zvětšit v některých částech tras rozsah oprav živichných vozovek. Obnovu místních komunikací dotčených stavbou v plochách mimo plochy stanovené v zadávací dokumentaci technologií recyklací za studena nebo zvětšením ploch živic uhradí obec.

Původní řešení dle smluvní (zadávací dokumentace):

- Opravy ploch místních komunikací mimo výkopové rýhy po stavbě kanalizace nebyly v zadávací dokumentaci řešeny.

Nové řešení:

Dojde k obnově komunikací pomocí recyklace za studena v tomto rozsahu

- gravitační kanalizace 870,43 m²

Změna rozsahu obrusných vrstev

- gravitační kanalizace 526,89 m²

ZMĚNOVÝ LIST č. 016

Název projektu: Odkanalizování obcí v povodí Jizery
 Číslo projektu: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007096

Zdůvodnění změny:	
- Odlišná skladba komunikace a rýže výkopu	
- Z hlediska ZZVZ jde o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222, odst. 5	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:	
a) zadávací dokumentace	ne
b) realizační (dílešská) dokumentace zhotovitele:	změna bude zpracována do DSPS
c) výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	ne
Předpokládaný vliv na:	
a) termín	ano
b) kvalitu	ne
c) cenu díla	ano

Náklady na změnu	Změna se bude týkat pouze nezpůsobilých nákladů projektu			
	Vícepráce		Méněpráce	
	bez DPH	včetně DPH	bez DPH	včetně DPH
stavební náklady	979 153,30 Kč	1 184 775,49 Kč	0,- Kč	0,- Kč
projekční náklady	0,- Kč	0,- Kč	0,- Kč	0,- Kč
celkem ZL č. 016 bez DPH	979 153,30 Kč			
celkem ZL č. 016 vč. DPH	1 184 775,49 Kč			

Změnu navrhuje:	Objednatel
------------------------	-------------------

Souhlas zhotovitele:	Zhotovitel se změnou souhlasí
-----------------------------	--------------------------------------


Datum: 29.07.2022

Jméno odpovědné osoby zhotovitele:

Ing. Martin Matzner

Podpis:

Razítko:


Ještěbská stavební společnost
 spol. s r.o. ®
 Selská 517, 460 01 Liberec XII - Staré Pavlovice
 IČ: 18382550 DiČ: CZ18382550

ZMĚNOVÝ LIST č. 016

Název projektu: Odkanalizování obcí v povodí Jizery
Číslo projektu: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007096

Souhlas projektanta:	Projektant se změnou souhlasí
----------------------	-------------------------------

Datum: 29. 7. 2022

Jméno odpovědné osoby projektanta: Ing. Martin Butor

Podpis:



Vodohospodářské inženýrské služby,
akciová společnost ①
Křížová 472/47
150 00 Praha 5

Razítko:

Souhlas a vyjádření správce stavby:	Správce stavby se změnou souhlasí
-------------------------------------	-----------------------------------

Datum:

Jméno odpovědné osoby správce stavby: p. Jiří Bouma

Podpis:



③ SPRÁVCE STAVBY
Sdružení „Garnets - Realstav MB”
Garnets Consulting a.s.
Realstav MB, spol. s r.o.
Odkanalizování obcí v povodí Jizery

Razítko:

Souhlas objednatele:	Objednatel se změnou souhlasí
----------------------	-------------------------------

Datum: 29. 7. 2022

Jméno odpovědné osoby objednatele: Ing. Tomáš Žitný

Podpis:



Razítko:

VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 88

Přílohy změnového listu:

1) Položkový rozpočet

Poznámka:

Malá Bělá, výstavba kanalizace, OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ:

VÝMĚRY ŘEŠENY V RÁMCI VaK (kanalizace / vodovod)

		VÝMĚRY (PODKLADNÍ VRSTVY RS)	VÝMĚRA (OBRUSNÉ VRSTVY)
SO 01	Stoka C4, C4-1 (K Prokůpkovi)	0,000	451,20
SO 01	Stoka C2 (U Vietnamce)	850,75	1 833,40
SO 01	Stoka C.3 (Hřiště)	292,95	880,10
SO 01	Stoky C6, C6-1, C1 (Nad Mostem přes Jizeru)		675,00
		1 143,70	3 839,70

POŽADAVEK NA CELKOVOU REKONSTRUKCI MK:

1 422,33 M2 4 574,90 M2

K DOFINANCOVÁNÍ OBEC MALÁ BĚLÁ:

		VÝMĚRY (PODKLADNÍ VRSTVY RS)	VÝMĚRA (OBRUSNÉ VRSTVY)
SO 01	Stoka C2 (U Vietnamce)	242,93	213
SO 01	Stoka C.3 (Hřiště)	35,7	63,90
SO 01	Stoky C6, C6-1, C1 (Nad Mostem přes Jizeru)		458,3
		278,63	735,20

Malá Bělá, výstavba kanalizace, OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ technologií POWERCEM:

VÝMĚRY ŘEŠENY V RÁMCI VaK (kanalizace / vodovod)


		VÝMĚRY (PODKLADNÍ VRSTVY RS)		VÝMĚRA (OBRUSNÉ VRSTVY)	
SO 01	Stoka C2 (U Vietnamce)	850,75		1222	
SO 01	Stoka C.3 (Hřiště)	292,95		279	
		1 143,70	M2	1 501,00	M2

POŽADAVEK NA CELKOVOU REKONSTRUKCI MK:

		1 422,33	M2	2339,8	M2
--	--	----------	----	--------	----

K DOFINANCOVÁNÍ město Bakov nad Jizerou:

		VÝMĚRY (PODKLADNÍ VRSTVY RS)		VÝMĚRA (OBRUSNÉ VRSTVY)	
SO 01	Stoka C2 (U Vietnamce)	242,93		213	
SO 01	Stoka C.3 (Hřiště)	35,7		34	
SO 01	Stoka C3 (Hřiště) jen ACO 11			176	
SO 01	Stoka C.2.2 jen ACO 11			415,8	
		278,63	M2	838,80	M2

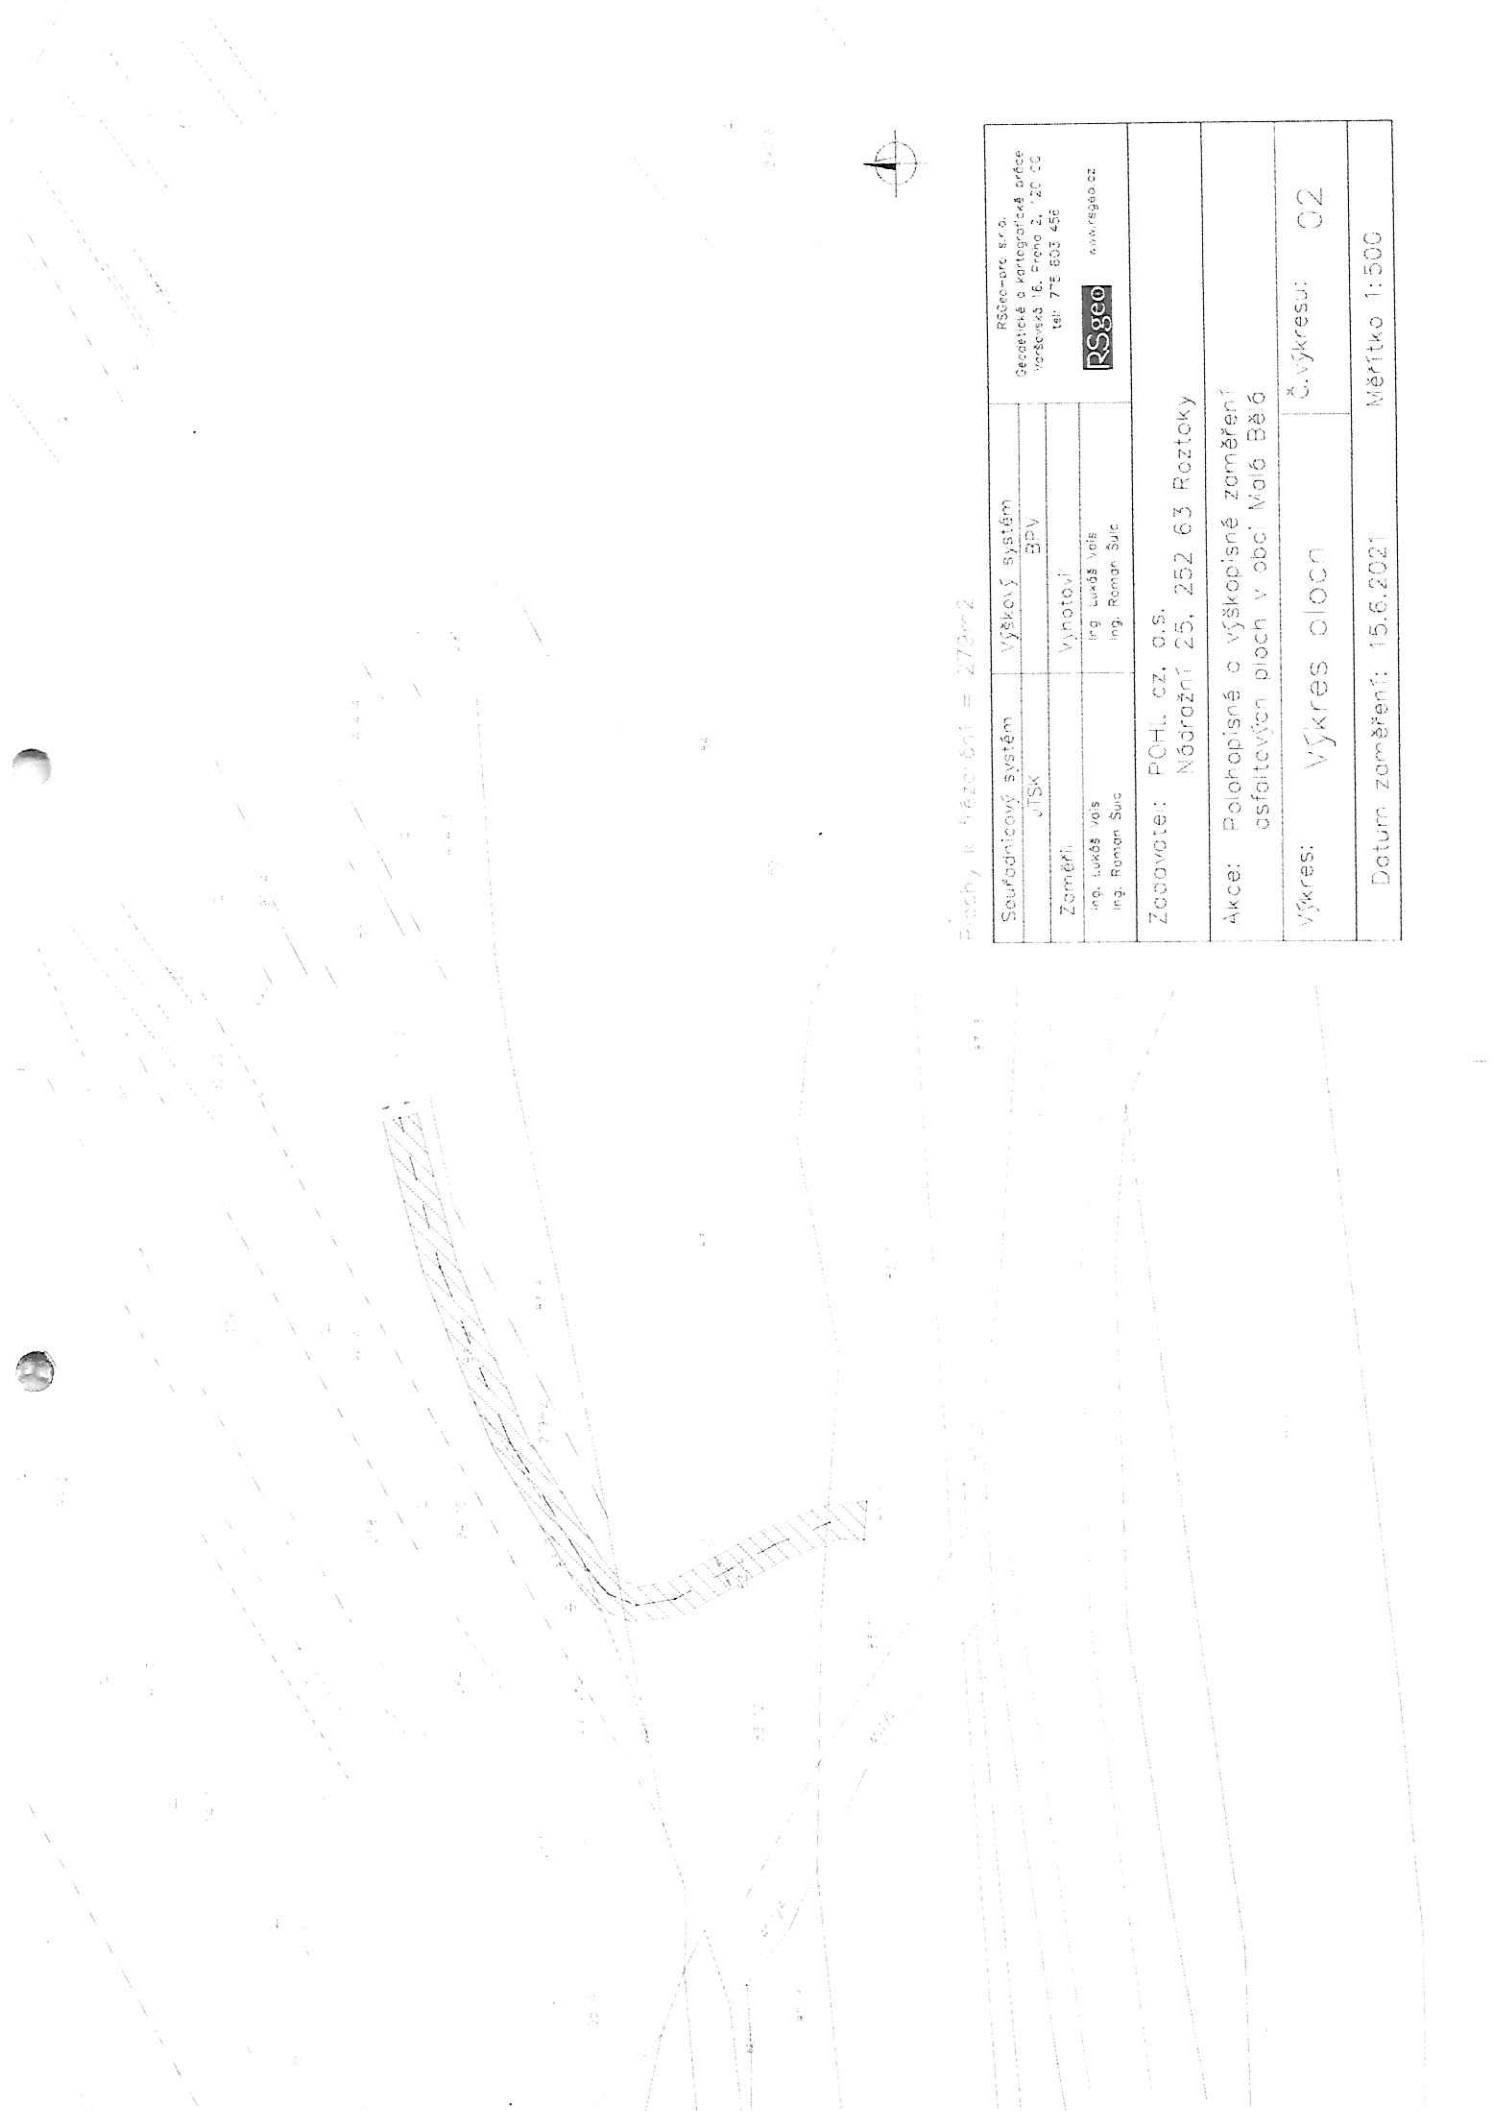

Průchý k měřeni = 270m²

RSgeo-urto s.r.o. Geodetické a kartografické práce Vorševská 16, Praha 2, 201 00 tel: 7-5 603 456 RSgeo www.rsgeo.cz	
Souřadnicový systém JTSK	Výškový systém BIV
Zaměření ing. Lukáš Vais ing. Roman Šuc	Vyhodnotil ing. Lukáš Vais ing. Roman Šuc
Zpracovatel: PCHL, o.z., o.s. Nábřeží 25, 252 63 Roztoky	
Akce: Polohopisné a výškopisné zaměření asfaltových ploch v obci Malá Bělá	
Výkres: Výkres ploch	č. výkresu: 02
Datum zaměření: 15.6.2021 Měřítko 1:500	



Plochy a potažení asfaltem = 302m²
 Plochy k potažení = 250m²



Soutřadnicový systém JTSK		Výškový systém BPV		RSgeo s.r.o. Geodézie a kartografické práce Varšavská 10, Praha 2, 170 00 tel. 275 603 496 
Zaměřil Ing. Lukáš Vališ Ing. Roman Šulc		Vyhotovil Ing. Lukáš Vališ Ing. Roman Šulc		
Zadavatel: POHL, a.s. Nádražní 25, 252 63 Roztoky				
Akce: Polohopisné a výškopisné zaměření asfaltových ploch v obci Malá Bělá				
Výkres: Vykres ploch			Č.výkresu: 01	
Datum zaměření: 15.6.2021			Měřítko 1:500	

Malá Bělá, výstavba kanalizace, OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ technologií pokládky ohrusné vrstvy ACO na živičnou vyrovnávku podkladu:

VÝMĚRY ŘEŠENY V RÁMCI VaK (kanalizace / vodovod)

		VÝMĚRY (PODKLADNÍ VRSTVY RS)	VÝMĚRA (OHRUSNÉ VRSTVY)
SO 01	Stoky C6, C6-1, C1 (Nad Mostem přes Jizeru)		675
SO 01	Stoka C.3 (Hřiště)		601,1
SO 01	Stoka C2 (U Vietnamce)		611,4
SO 01	Stoka C4, C4-1 (K Prokúpkovi)		451,2
		0,00	2 338,70
			M2

POŽADAVEK NA CELKOVOU REKONSTRUKCI MK:

		0,00	M2	2826,9	M2
--	--	------	----	--------	----

K DOFINANCOVÁNÍ město Bakov nad Jizerou:

		VÝMĚRY (PODKLADNÍ VRSTVY RS)	VÝMĚRA (OHRUSNÉ VRSTVY)
SO 01	Stoky C6, C6-1, C1 (Nad Mostem přes Jizeru)		458,3
SO 01	Stoka C.3 (Hřiště)		29,9
SO 01	Stoka C2 (U Vietnamce)		0,00
SO 01	Stoka C4, C4-1 (K Prokúpkovi)		0,00
		0,00	488,20
			M2



15-000000 15-00
15-000000 15-00
15-000000 15-00
15-000000 15-00
15-000000 15-00
15-000000 15-00
15-000000 15-00
15-000000 15-00
15-000000 15-00
15-000000 15-00

15-000000 15-00


Map 114
City of Saskatoon
Planning Department
NRZ Geomatics
8/8/2007

8500
City of Saskatoon



Klas: Mohl 606
stav: systém d156, 10v
množko: 2520
zamer: ing. SAFRANEK Jan
NEZ/Geodet. úst. a.
852002

stredná časť: 100.362

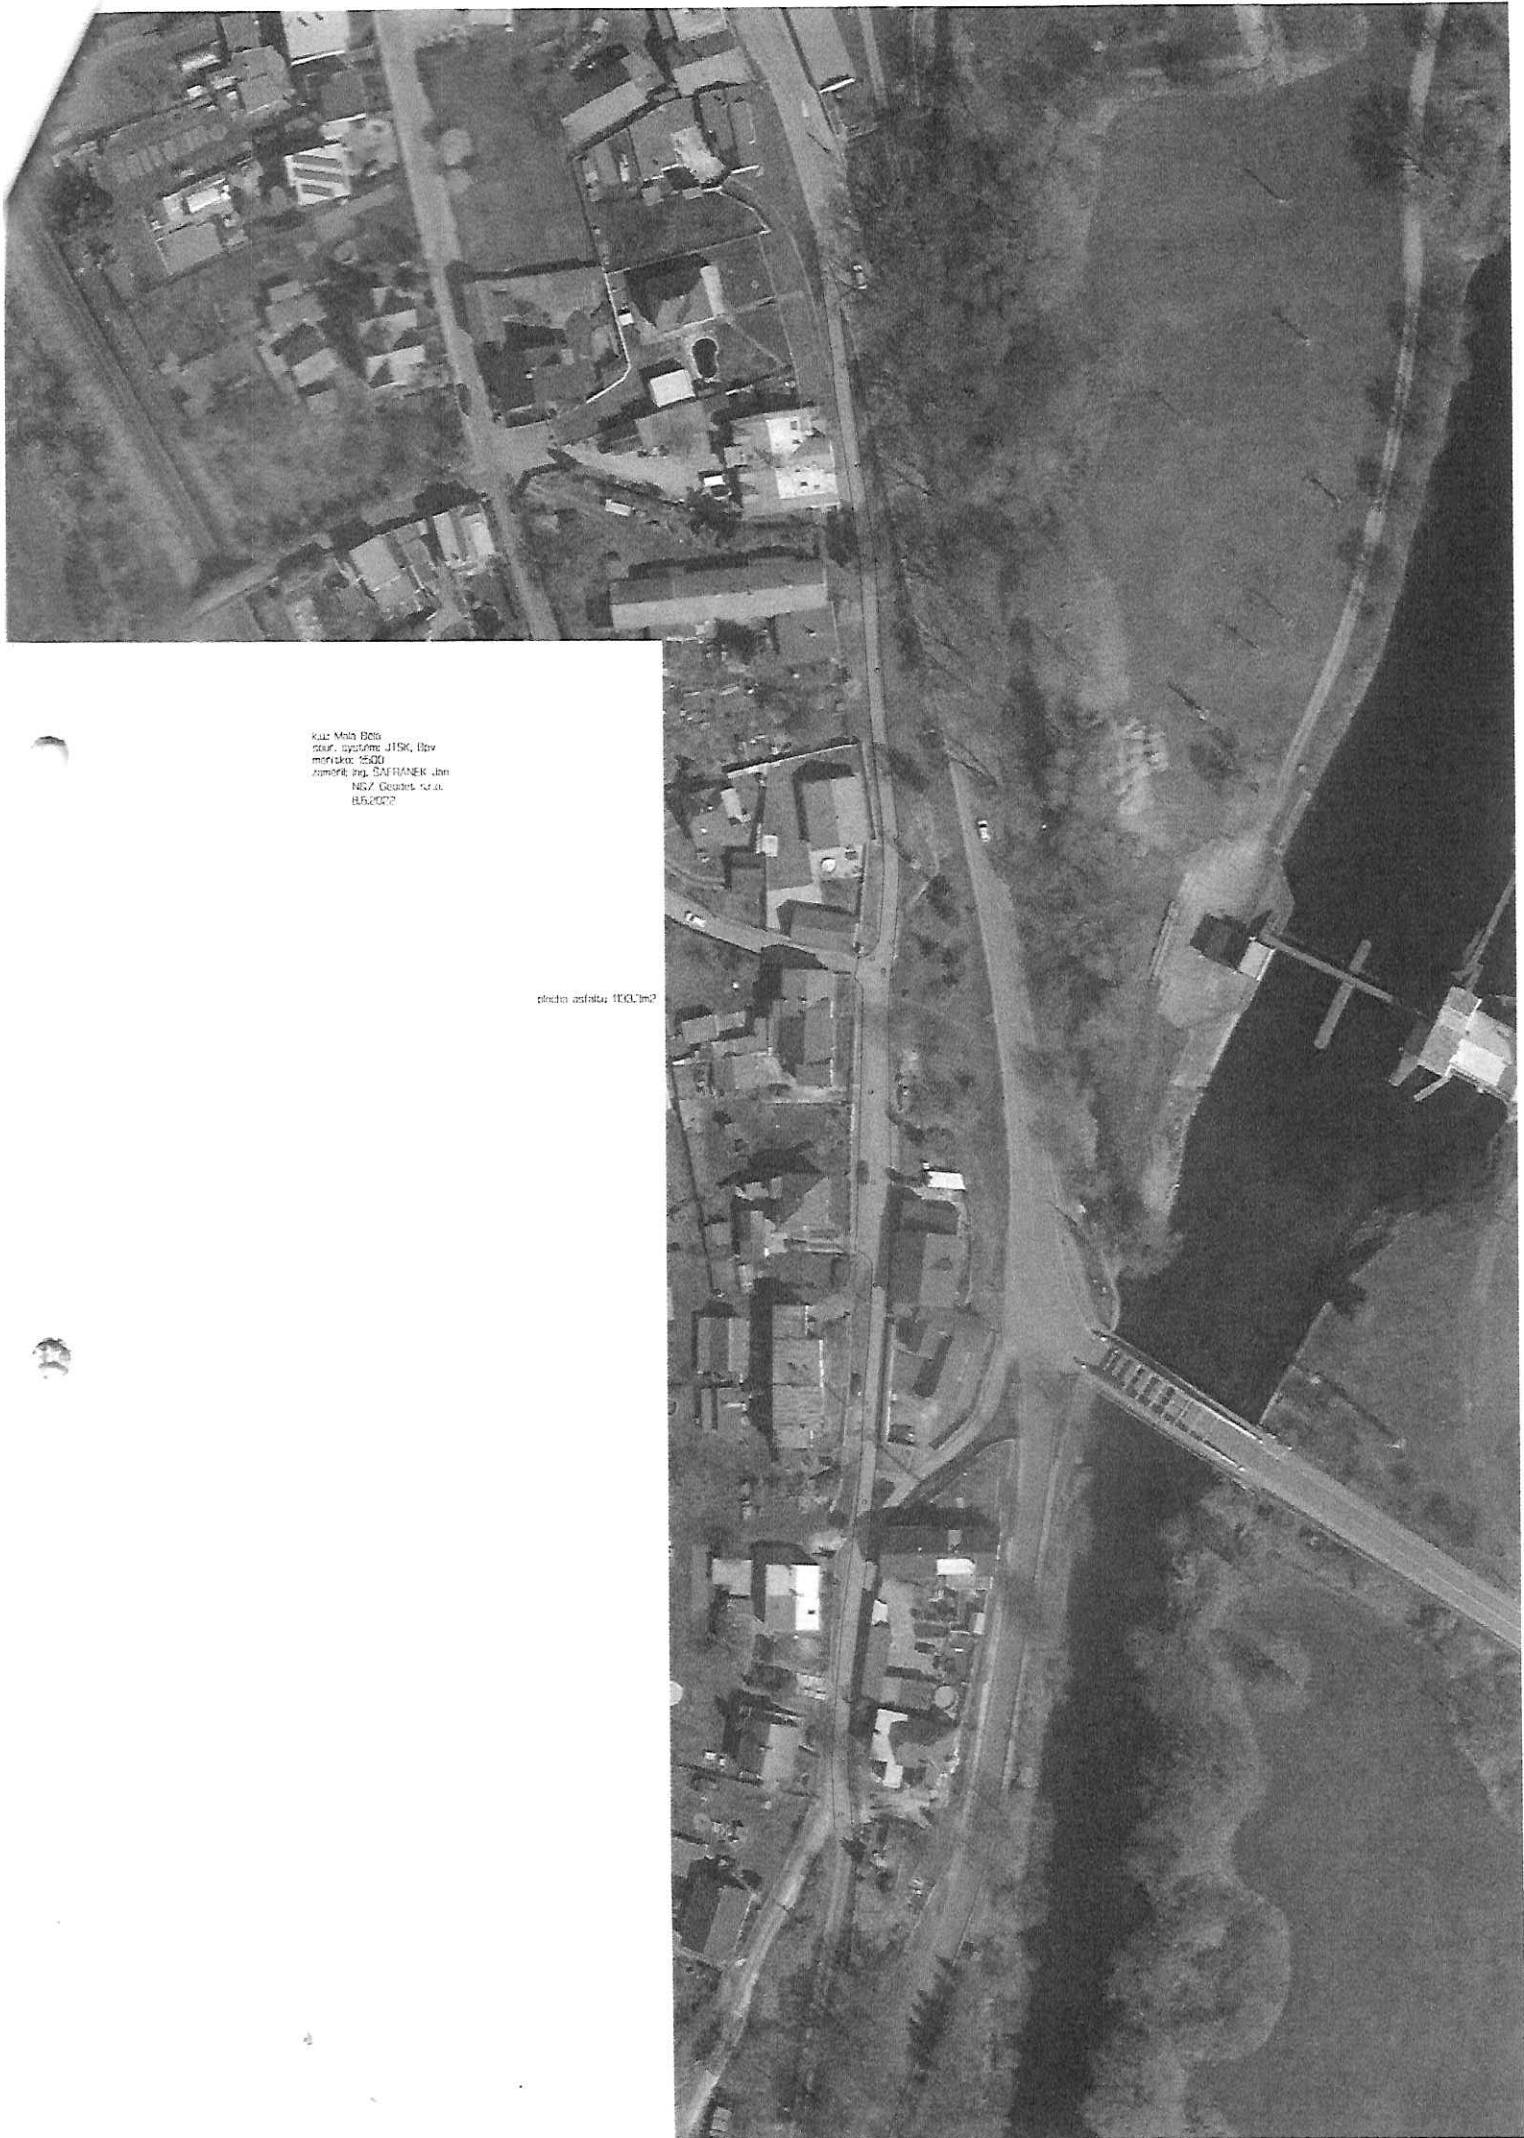

ZL00?_Malá Bělá - Změna skladby asfaltové komunikace MK 864 311,12

Malá Bělá - neuznatelné	646 103,66	Malá Bělá - uznatelné	218 207,46
Malá Bělá - neuz méněpr	0,00	Malá Bělá - uz méněpr	0,00
Malá Bělá - neuz vícepr	646 103,66	Malá Bělá - uz vícepr	218 207,46
Powercem	360 684,21	Powercem, chyba psaní	218 207,46
živice	285 419,45		

Malá Bělá - vícepráce obec 864 311,12

285 419,45

864 311,12

1,16261

140 545,63

1 004 856,75

Celkem bez DPH

211 019,92

DPH 21%

1 215 876,67

Celkem bez DPH

114 842,18

VaK

979 153,30

ZMĚNOVÝ LIST č. 017

Název projektu: Odkanalizování obcí v povodí Jizery
Číslo projektu: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007096

Objednatel: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Čechova 1151 293 22 Mladá Boleslav	Změnový list číslo: 017
Zhotovitel: Sdružení Odkanalizování obcí v povodí Jizery, část C; společnost Selská 517 460 01 Liberec XII	Datum vydání:
Správce stavby: Sdružení „Garnets – Realstav MB“ Garnets Consulting a.s. Československých legií 445/4 415 01 Teplice	Číslo smlouvy:

Název pod-projektu
SO/PS dotčené změnou:

Odkanalizování obcí v povodí Jizery – část C
02) Hrdlořezy, výstavba kanalizace
06) Malá Bělá, výstavba kanalizace

Stručný popis změny:

Inflační navýšení prací v roce 2022

Popis změny, technického řešení:

Zhotovitel sledává probíhající válku na Ukrajině spojenou s invazí vojsk Ruské federace na Ukrajinu, počínaje dnem 24.2.2022 „Překážkou vyšší moci“

Původní řešení dle smluvní (zadávací dokumentace):

Nové řešení:

Zhotovitel navrhuje objednateli indexaci cen prací a dodávek, které realizoval v roce 2022. Hodnota indexů meziročního nárůstu cen (období 01 2022/01 2021) pro obor 827 5 ve výši 1,1626 je stanovena na základě potvrzení ÚRS CZ a.s. č.j. 4D/2022/003 z 8.6.2022, Ing. arch. Karel Březina, vedoucí informační služby ÚRS CZ a.s. Indexovány budou jen práce a dodávky provedené od května 2022.

Zdůvodnění změny:

Překážka vyšší moci má již v tuto chvíli dopad na realizované Dílo dle Smlouvy:

- Výpadky zaměstnanců Zhotovitele a zaměstnanců subdodavatelů, neboť při realizaci stavebních prací Zhotovitel i celý stavební sektor ve velké míře vyžívá i pracovníků z Ukrajiny, kteří se však jednak nemohou dostavit na území České republiky za účelem plnění pracovních úkolů, případně odcházejí do vlasti narukovat do ukrajinské armády.
- Absence stavebního materiálu na celosvětovém trhu a negarantované dlouhé dodací lhůty (řezivo, překližky, ocelové a jiné kovové výrobky, trubní materiál PVC a PE, zdící materiál).
- Skokový nárůst cen stavebních materiálů (ocel a jiné kovy, dřevo, stavební chemie, betonové výrobky, potrubní materiál, armatury, elektroinstalační a izolační materiál aj.) bez možnosti dlouhodobé fixace ceny.
- Nekontrolovaný nárůst ceny ropy a potažmo výrobků z ropy, tzn. mimo jiné pohonných hmot a asfaltových pojiv, tato oblast výrobků obzvláště ovlivňuje náklady stavby protože v závěrečné

ZMĚNOVÝ LIST č. 017

Název projektu: **Odkanalizování obcí v povodí Jizery**
 Číslo projektu: **CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007096**

fázi probíhají opravy živičných komunikací po stavbě kanalizace a navíc stavbou dotčené obce přicházejí s požadavkem na zvětšení rozsahu oprav místních komunikací a ty se již za nabídkové ceny z roku 2019 nedají realizovat.

- Enormní navýšení cen vstupů energií nutných pro výrobu převážně asfaltobetonových i betonových směsí (plyn, elektrická energie).

Z hlediska ZZVZ jde o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222, odst. 4

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

- | | |
|---|----|
| a) zadávací dokumentace | ne |
| b) realizační (dílenská) dokumentace zhotovitele: | ne |
| c) výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval: | ne |

Předpokládaný vliv na:

- | | |
|--------------|-----|
| a) termín | ne |
| b) kvalitu | ne |
| c) cenu díla | ano |

Náklady na změnu	Změnou budou navýšeny pouze nezpůsobilé náklady projektu			
	Vícepráce		Méněpráce	
	bez DPH	včetně DPH	bez DPH	včetně DPH
stavební náklady	3 526 110,27 Kč	4 266 593,42 Kč	0,- Kč	0,- Kč
celkem ZL č. 017 bez DPH	3 526 110,27 Kč			
celkem ZL č. 017 vč. DPH	4 266 593,42 Kč			

Změnu navrhuje:	Objednatel
------------------------	-------------------

Souhlas zhotovitele:	Zhotovitel se změnou souhlasí
-----------------------------	--------------------------------------


Datum: 29.07.2022

Jméno odpovědné osoby zhotovitele:

Ing. Martin Matzner

Podpis:

Razítko:


Ještědská stavební společnost
spol. s r.o. ①
 Selská 517, 460 01 Liberec XII - Staré Pavlovice
 IČ: 18282550 DIČ: CZ18282550

ZMĚNOVÝ LIST č. 017

Název projektu: Odkanalizování obcí v povodí Jizery
Číslo projektu: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007096

Souhlas projektanta:	Projektant se změnou souhlasí
----------------------	-------------------------------

Datum:

Jméno odpovědné osoby projektanta:

Ing. Roman Bárta

ŠINDLAR s.r.o.
Na Brně 372/2a, 500 06 Hrádec Králové
tel.: 495 402 560 • www.sindlar.cz
IČ: 260 03 236, DIČ: CZ26003236 -07-

Podpis:



Razítko:

Souhlas projektanta:	Projektant se změnou souhlasí
----------------------	-------------------------------

Datum:

29.7. 2022

Jméno odpovědné osoby projektanta:

Ing. Martin Butor

**Vodohospodářské inženýrské služby,
akciová společnost** ①
Křížová 472/47
150 00 Praha 5

Podpis:



Razítko:

Souhlas a vyjádření správce stavby:	Správce stavby se změnou souhlasí
-------------------------------------	-----------------------------------

Datum:

Jméno odpovědné osoby správce stavby:

p. Jiří Bouma

③ **SPRÁVCE STAVBY**
Sdružení „Gamets - Realstav MB”
Gamets Consulting a.s.
Realstav MB, spol. s r.o.
Odkanalizování obcí v povodí Jizery

Podpis:



Razítko:

Souhlas objednatele:	Objednatel se změnou souhlasí
----------------------	-------------------------------

Datum:

29.7. 2022

Jméno odpovědné osoby objednatele:

Ing. Tomáš Žitný

Podpis:



Razítko:

**VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.**
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 88

Přílohy změnového listu:

1)

Poznámka:



NÁZEV AKCE: **Odkanalizování obcí v povodí Jizery, část C**

UCELENÁ ČÁST STAVBY: 2) Hrdlořezy, výstavba kanalizace; 6) Malá Bělá, výstavba kanalizace; 10) Horní Stakory, výstavba kanalizace
ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE: Smlouva o dílo uzavřená dne 20.3.2020, Projekt: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007096
ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE: Smlouva o společnosti uzavřená dne 12.8.2019

OBJEDNATEL: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.

ZHOTOVITEL: Sdružení Odkanalizování obcí v povodí Jizery, část C; společnost

SDRUŽENÍ: Ještědská stavební společnost spol. s r.o.; POHL cz

REKAPITULACE VALORIZACE

zkrácený popis	Práce za 05-07/2022
HRDLOŘEZY VALORIZACE	cena bez DPH
MALÁ BĚLÁ - VALORIZACE	2 205 901,36 Kč
VALORIZACE CELKEM	1 320 208,91 Kč
JIZERA ČÁST C	3 526 110,27 Kč

Zhotovitel:

Jaroslav Hájek

Správce stavby:

Jiří Bouma

Objednatel:

Ing. Tomáš Žitný



Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
Čechova ul. 1151
293 22 Mladá Boleslav

Oznámení výskytu okolnosti vyšší moci

„stavba – Odkanalizování obcí v povodí Jizery – část C“

Vážení,

Společnost Ještědská stavební společnost spol. s r.o. se sídlem Selská 517, 460 01 Liberec XII–Staré Pavlovice, IČ 18382550, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. C 363 (dále jen jako „Zhotovitel“), ve vztahu ke stavbě, kterou na pozici Zhotovitele provádí pro Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. (dále jen „Investor“ nebo „Objednatel“), na základě uzavřené Smlouvy o dílo č. VRI/SOD/2020/13/Ži ze dne 20.03.2020 ve znění případných dodatků (dále jen jako „Smlouva“), Vám oznamuje zastížení mimořádnou, nepředvídatelnou a neodvratitelnou okolností, kterou nemůže Zhotovitel ovlivnit, ani se jí vyhnout, a která s nejvyšší mírou pravděpodobnosti nepříznivě ovlivní průběh realizace díla specifikovaného ve Smlouvě (dále jen jako „Dílo“) a ve svých důsledcích povede k navýšení smluvní ceny Díla a (nebo) zpoždění provádění Díla.

Zhotovitel shledává touto okolností probíhající válku na Ukrajině spojenou s invazí vojsk Ruské federace na Ukrajinu, počínaje dnem 24.2.2022 (dále jen „**Překážka vyšší moci**“).

V důsledku válečné agrese Ruské federace (i) byl na území Ukrajiny vyhlášen válečný stav; (ii) byla na území Ukrajiny vyhlášena všeobecná mobilizace mužů ve věci od 18 do 60 let, kteří tak nemohou opustit území Ukrajiny; (iii) byla na území Ukrajiny zastavena veškerá výroba a dodávky výrobků; (iv) byly uvaleny ekonomické, administrativní a jiné sankce na Ruskou federaci, pročež je fakticky znemožněn obchod s touto zemí, (v) nastala situace přímo či nepřímo vede k eskalaci cen komoditních surovin na celosvětovém trhu, a (vi) v neposlední řadě byl v souvislosti s ruskou agresí na Ukrajině mimo jiné vyhlášen počínaje dnem 4.3.2022 na území České republiky nouzový stav z důvodu značného ohrožení vnitřního pořádku a bezpečnosti v souvislosti s migrační vlnou velkého rozsahu, k níž dochází na území České republiky, a to na dobu příštích 30 dnů - o jeho vyhlášení podle č. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1999 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění pozdějších předpisů rozhodla vláda usnesením č. 147 na schůzi ve středu 2.3.2022.

Překážka vyšší moci má již v tuto chvíli dopad na námi realizované Dílo dle Smlouvy:

- Výpadky zaměstnanců Zhotovitele a zaměstnanců subdodavatelů, neboť při realizaci stavebních prací Zhotovitel i celý stavební sektor ve velké míře využívá i pracovníků z Ukrajiny, kteří se však nemohou dostavit na území České republiky za účelem plnění pracovních úkolů, případně odcházejí do vlasti narukovat do ukrajinské armády.

spisová zn. KS Ústí n.L. C.363

Telefon/fax: správa 48 513 48 48
MTZ 48 510 34 15

Bankovní spojení: ČS Liberec, č.ú.: 9029040402/0800
Bankovní spojení: KB Liberec, č.ú.: 9029040461/0100

IČO: 18382550
DIČ: CZ18382550



JEŠTĚDSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST

spol. s r.o., Selská 517, 460 01 Liberec XII – Staré Pavlovice

- Absence stavebního materiálu na celosvětovém trhu a negarantované dlouhé dodací lhůty (řezivo, překližky, ocelové a jiné kovové výrobky, trubní materiál PVC a PE, zdící materiál).
- Skokový nárůst cen stavebních materiálů (ocel a jiné kovy, dřevo, stavební chemie, betonové výrobky, potrubní materiál, armatury, elektroinstalační a izolační materiál aj.) bez možnosti dlouhodobé fixace ceny.
- Nekontrolovaný nárůst ceny ropy a potažmo výrobků z ropy, tzn. mimo jiné pohonných hmot a asfaltových pojiv.
- Enormní navýšení cen vstupů energií nutných pro výrobu převážně asfaltobetonových i betonových směsí (plyn, elektrická energie).

Je tedy zřejmé, že Překážka vyšší moci je způsobila bránit Zhotoviteli v plnění jeho závazků dle Smlouvy.

Zhotovitel v rámci dané situace přijímá opatření a vynakládá veškeré přiměřené úsilí, aby v provádění Díla pokračoval za dohodnutých podmínek, nicméně vzhledem k do značné míry nepředvídatelnému vývoji situace Zhotovitel nemůže vyloučit zpoždění termínů provádění Díla a navýšení nákladů na Dílo, popř. že z výše uvedených důvodů bude Zhotovitel nucen až do odpadnutí oznámení Překážky vyšší moci přerušit provádění veškerých stavebních prací na Díle.

Na základě shora uvedeného již nyní v souladu se zásadou opatrnosti Objednatele z pozice Zhotovitele na Překážku vyšší moci a její možné důsledky upozorňujeme, a dovoluujeme si požádat Objednatele o součinnost při řešení dopadů nastalé skutečnosti včetně přijetí preventivních opatření směřujících k minimalizaci negativních důsledků.

Dále žádáme o součinnost při jednání o časovém a finančním vlivu na Smlouvu. Opětovně poukazujeme na zcela mimořádné a nepředvídatelné okolnosti, které dokončení Díla podstatně ztěžují, resp. znemožňují jej, nebude-li Objednatelem přistoupeno ke spravedlivé kompenzaci a narovnání ztížených podmínek.

S pozdravem

V Liberci dne 06.04.2022

Josef Kubeš
ředitel společnosti, jednatel

Josef
Kubeš

Digitálně podepsal
Josef Kubeš
Datum: 2022.04.06
20:38:32 +02'00'

spisová zn. KS Ústí n.L. C.363

Telefon/fax: správa 48 513 48 48
MTZ 48 510 34 15

Bankovní spojení: ČS Liberec, č.ú.: 9029040402/0800
Bankovní spojení: KB Liberec, č.ú.: 9029040461/0100

IČO: 18382550
DIČ: CZ18382550

Pan Martin Matzner
obchodní ředitel
Ještědská stavební
společnost spol. s r. o.
Selská 517

460 01 LIBEREC XII - Staré Pavlovice

Č.j. 4D/2022/003

Vyřizuje: Ing. arch. Karel Březina
Brno
8. 6. 2022

Dobrý den.

Potvrzuji hodnotu následujících indexů:

Obor 827 5 Vedení trubní dálková a přípojná - kamenina

Za období

2021 02/2021 01	1,102
2022 01/2021 02	1,055
2022 01/2021 01	1,1626

V hodnotě indexů jsou započteny změny cen stavebních prací včetně všech dotčených složek potřeb tj. materiálů, strojů, mzdových nákladů.

S pozdravem



Ing. arch. Karel Březina
vedoucí informační služby ÚRS CZ a.s.
pracoviště Šumavská 35, 602 00 Brno

mobil: 702 151 123
karel.brezina@urs.cz
www.urs.cz





NÁZEV AKCE: Odkanalizování obcí v povodí Jizery, část C

Rekapitulace konečné ceny díla

UCELENÁ ČÁST STAVBY: 2) Hrdlořezy, výstavba kanalizace; 6) Malá Bělá, výstavba kanalizace; 10) Horní Stakory, výstavba kanalizace; 10) Horní Stakory, výstavba kanalizace

ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE: Smlouva o dílo uzavřená dne 20.3.2020, Projekt: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007096

ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE: Smlouva o společnosti uzavřená dne 12.8.2019

OBJEDNATEL: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.

ZHOTOVITEL: Sdružení Odkanalizování obcí v povodí Jizery, část C; společnost

SDRUŽENÍ: Jekřetská stavební společnost spol. s r.o.; POHL cz

Cena díla dle SdD 287 028 073,50

SOD	Číslo změnového listu	Etapa stavby	Stručný popis změny	vícepráce		méněpráce		Cena změny	Vypořádaní z Hlediska ZZVZ
				Způsobilé	Nezpůsobilé	Způsobilé	Nezpůsobilé		
Dodatek SOD č. 1	Změnový list č. 1	6) Malá Bělá	Změna rozsahu obnovy vodovodních řadů	0,00	10 763 674,08	0,00	0,00	10 763 674,08	§ 222, odst. 5
	Změnový list č. 2	6) Malá Bělá	Změna technologie ČSOV 3	1 007 229,11	0,00	-978 663,81	0,00	28 565,30	§ 222, odst. 4
	Celkem dod č. 1			1 007 229,11	10 763 674,08	-978 663,81	0,00	10 792 239,38	
	Cena díla po uzavření dodatku č. 1							297 820 312,88	
Dodatek SOD č. 2	Změnový list č. 3	2) Hrdlořezy	Komunikace VaK	2 734 297,13	874 405,03	-2 999 347,16	-879 872,20	-3 879 219,36	§ 222, odst. 4
	Změnový list č. 4	2) Hrdlořezy	Komunikace obec	0,00	2 165 254,41	0,00	0,00	2 165 254,41	§ 222, odst. 5
	Změnový list č. 5	10) Horní Stakory	Komunikace VaK	1 272 051,49	922 789,59	-2 638 879,82	-1 982 352,62	-4 621 232,44	§ 222, odst. 4
	Změnový list č. 6	10) Horní Stakory	Komunikace obec	0,00	3 873 102,15	0,00	0,00	3 873 102,15	§ 222, odst. 5
	Změnový list č. 7	6) Malá Bělá	Komunikace	2 212 376,94	199 207,53	-2 360 376,85	-2 342 336,60	-4 702 713,45	§ 222, odst. 4
	Změnový list č. 8	2) Hrdlořezy	neprovedené práce	0,00	0,00	-605 233,94	-374 632,15	-979 866,09	§ 222, odst. 4
	Změnový list č. 9	10) Horní Stakory	neprovedené práce	0,00	0,00	-317 517,42	-1 205 047,90	-1 522 565,32	§ 222, odst. 4
	Změnový list č. 10	6) Malá Bělá	neprovedené práce	0,00	0,00	-1 499 675,09	0,00	-1 499 675,09	§ 222, odst. 4
	Celkem dod č. 2			6 218 725,56	8 034 758,71	-10 421 030,28	-6 784 241,47	-17 205 271,75	
	Cena díla po uzavření dodatku č. 2							294 868 525,40	
Dodatek SOD č. 3	Změnový list č. 11	6) Malá Bělá	Příjezdové komunikace, mostek	0,00	515 693,78	-95 248,33	0,00	420 445,45	§ 222, odst. 4
	Změnový list č. 12 - doměrkový rozpočet Horní Stakory	10) Horní Stakory	doměrkový rozpočet, nezpůsobilé náklady	0,00	206 327,97	0,00	0,00	206 327,97	§ 222, odst. 4
		10) Horní Stakory	doměrkový rozpočet, způsobilé náklady	0,00	0,00	-299 816,60	0,00	-299 816,60	§ 222, odst. 4
	Změnový list č. 13 - doměrkový rozpočet Hrdlořezy	2) Hrdlořezy	doměrkový rozpočet, nezpůsobilé náklady	0,00	0,00	0,00	-498 105,71	-498 105,71	§ 222, odst. 4
		2) Hrdlořezy	doměrkový rozpočet, způsobilé náklady	247 920,55	0,00	0,00	0,00	247 920,55	§ 222, odst. 4
	Změnový list č. 14 - doměrkový rozpočet Malá Bělá	6) Malá Bělá	doměrkový rozpočet, nezpůsobilé náklady	0,00	224 709,87	0,00	0,00	224 709,87	§ 222, odst. 4
		6) Malá Bělá	doměrkový rozpočet, způsobilé náklady	0,00	2 645 064,49	-451 735,95	0,00	2 193 328,54	§ 222, odst. 4
	Změnový list č. 15	2) Hrdlořezy	Hrdlořezy, místní komunikace obec	0,00	4 440 407,91	-1 170 236,35	-1 317 632,77	3 122 775,14	§ 222, odst. 5
	Změnový list č. 16	6) Malá Bělá	Malá Bělá, místní komunikace obec	0,00	979 153,30	0,00	0,00	979 153,30	§ 222, odst. 5
	Změnový list č. 17	Celá etapa	Inflační navýšení prací v roce 2022	0,00	3 526 110,27	0,00	0,00	3 526 110,27	§ 222, odst. 4
Celkem dod č. 3			247 920,55	12 537 467,58	-12 017 037,23	-645 502,13	-2 662 639,36		
Cena díla po uzavření dodatku č. 3							304 991 374,17		
Celkem ZL-§ 222, odst. 4 (15%)			7 225 954,67	9 114 308,53	-12 246 494,97	-7 282 347,18	-19 528 842,15	35 869 105,35 Kč	
Celkem ZL-§ 222, odst. 5			0,00	11 457 917,77	-1 170 236,35	-147 396,42	-1 317 632,77	12 775 550,54 Kč	
