



# DODATEK Č. 1

## KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: VRI/SOD/2013/32/D1

číslo smlouvy zhotovitele: 1TC131254

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

### Článek I.

#### Smluvní strany

**Objednatel:** Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.  
se sídlem: Čechova ul. 1151, 293 22 Mladá Boleslav  
zastoupený: Ing. Jan Sedláček, předseda představenstva  
Ing. Vladimír Stehlík, člen představenstva  
ve věcech technických oprávněn jednat:  
Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek  
Ing. Miloš Kafluk, technik oddělení VRI  
bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100  
IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983  
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2379  
(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:** FORTEX - AGS, a.s.  
se sídlem: Šumperk, Jilová 1550/1, PSČ 787 92  
zastoupený: Mgr. Tomáš Potěšil, místopředseda představenstva  
ve věcech technických oprávněn jednat:  
Ing. Roman Ženčák, vedoucí výroby  
bankovní spojení: ČSOB Šumperk, č.ú. 8010-409000153/0300  
IČ: 00150584 DIČ: CZ699000025  
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 95  
(dále jen „zhotovitel“)

název akce : **Kněžmost ČOV, rekonstrukce**

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách ve smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele: VRI/SOD/2013/32 a číslo smlouvy zhotovitele: 1TC131254 v čl. IV, X a XII. Mění se následující články původní SOD.

## Článek IV.

### Doba plnění

#### **Dosavadní znění článku IV. bodu 1. se nahrazuje tímto zněním:**

Zhotovitel se zavazuje do 10.5.2015 uvést novou ČOV do provozu včetně provedení komplexních a individuálních zkoušek.

Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo do 1. 6. 2015 dle harmonogramu prací předaného zhotovitelem objednateli, který je nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy o dílo a tvoří jeho přílohu č. 1.

Termín dokončení díla : **1.6.2015**

Termín dokončení díla se mění s ohledem na nepředvídatelné prodloužení řízení na výběr zhotovitele, které bylo zahájeno v únoru 2013 kvalifikační uchazečů. Zhotovitel byl vybrán v únoru 2014, protože někteří uchazeči byli požádáni o doplňující informace k předložené nabídce. Zhotovitel v době trvání řízení získal další zakázky a neměl stavební kapacitu, aby mohl okamžitě stavbu nové ČOV Kněžmost zahájit. Došlo k prodloužení zahájení stavby. S touto časovou ztrátou již nebyl zhotovitel schopen dodržet termín dokončení díla dle uzavřené smlouvy o dílo. Vzhledem k nadcházejícímu zimnímu období a vzhledem k tomu, že objednatel má hlavní zájem na kvalitě prováděných prací, se smluvní strany dohodly na změně termínu dokončení díla. Objednatel dokončení prací v tomto termínu požadoval v zadávacím řízení.

## Článek VII.

### Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

Vzhledem k prodloužení termínu dokončení díla vznikne objednateli neplánovaný výdaj v úhradě nákladů za činnost TDI a koordinátora BOZP na stavbě. Zhotovitel uhradí tyto vícenáklady, které nepřesáhnou částku 150.000 Kč bez DPH. Přesná částka bude upřesněna po dokončení celého díla.

## Článek X.

### Smluvní pokuty

#### **Dosavadní znění článku X. bodu 1. se nahrazuje tímto zněním:**

V případě prodloužení Zhotovitele se splněním termínu dokončení díla sjednaného v čl. IV. odst. 1 této smlouvy zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 14 000,- Kč za každý den prodloužení.

Smluvní pokuta dle dodatku č.1 SOD **14 000,- Kč**

#### **Dosavadní znění článku X. bodu 2. se nahrazuje tímto zněním:**

V případě prodloužení Zhotovitele se splněním mílníku v platném harmonogramu prací, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý případ a den prodloužení.

Smluvní pokuta dle dodatku č.1 SOD **10 000,- Kč**

## Článek XII.

### Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy neupravené tímto dodatkem smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných tímto dodatkem smlouvy, budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným soudem.

3. Tento dodatek smlouvy se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
4. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tento dodatek smlouvy přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Tento dodatek smlouvy má tři strany.

**V ostatních ustanoveních zůstává smlouva o dílo číslo smlouvy objednatele: VRI/SOD/2013/32 a číslo smlouvy zhotovitele: 1TC131254 v platnosti bez změn.**

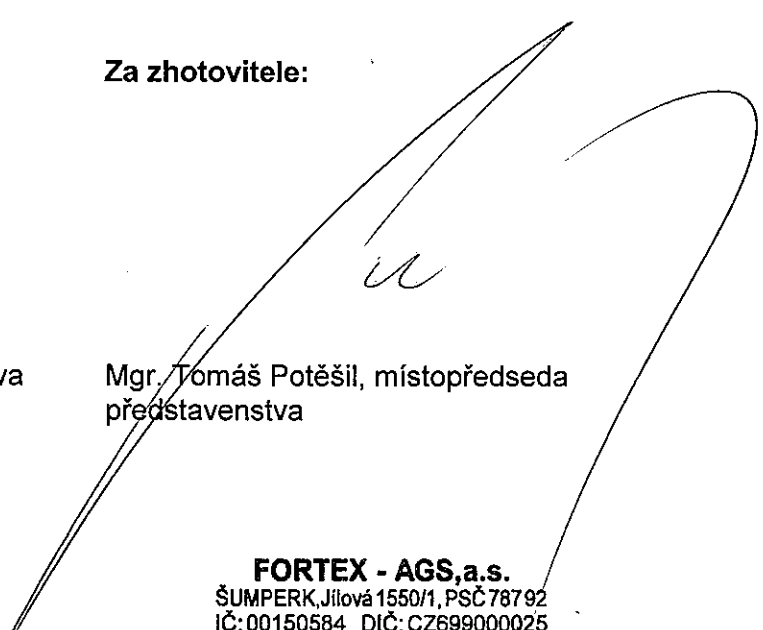
V Mladé Boleslavi dne 28. 11. 2014


V Šumperku dne 26. 11. 2014

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

  
Ing. Jan Sedláček, předseda představenstva

  
Mgr. Tomáš Potěšil, místopředseda představenstva

  
Ing. Vladimír Stehlík, člen představenstva

**FORTEX - AGS, a.s.**  
ŠUMPERK, Jilová 1550/1, PSČ 78792  
IČ: 00150584 DIČ: CZ699000025  
tel.: 583 310 111 www.fortex.cz  
-3-

**VODOVODY A KANALIZACE  
MLADÁ BOLESLAV, a.s.**  
Čechova 1151  
293 22 Mladá Boleslav 88



- Osazení aeračních roštů	58	2.2.2015	31.3.2015
- Osazení uklidňovacích zón	58	2.2.2015	31.3.2015
- Potrubí rozvodu vzduchu	58	2.2.2015	31.3.2015
<b>*DN</b>			
- Nátok do DN a uklidňovací válec	58	2.2.2015	31.3.2015
- Žlaby a potrubí čisté vody	58	2.2.2015	31.3.2015
- Mamutky	58	2.2.2015	31.3.2015
- Potrubí vratného kalu	58	2.2.2015	31.3.2015
- Potrubí přebytečného kalu	58	2.2.2015	31.3.2015
<b>*Kalová jímka</b>			
- Aerční rošty	58	2.2.2015	31.3.2015
- Potrubí přebytečného kalu	58	2.2.2015	31.3.2015
- Potrubí odsazené vody	58	2.2.2015	31.3.2015
<b>*Dmýchárna</b>			
- Osazení dmychadel	395	1.4.2014	30.4.2015
- Rozvod tlakového vzduchu	60	2.3.2015	30.4.2015
<b>*Dávkování síranu</b>			
- Osazení nádrže na síran a dávkovací stanice	60	2.3.2015	30.4.2015
- Potrubí síranu	60	2.3.2015	30.4.2015
<b>*Individuální a komplexní zkoušky</b>	40	1.4.2015	10.5.2015
<b>*Vypracování provozního řádu pro zkušební provoz</b>	86	5.1.2015	31.3.2015
<b>PS 02 Elektrotechnologická část</b>	39	23.3.2015	30.4.2015
- Montáž kabelových tras, stojanů - Aktivace	39	23.3.2015	30.4.2015
- Montáž kabelových tras, stojanů - DN, Kalová	39	23.3.2015	30.4.2015
- Montáž kabelových tras, stojanů - ČS, Hrubé	39	23.3.2015	30.4.2015
- Montáž kabelových tras, Dmýchárna	39	23.3.2015	30.4.2015
- Kabeláž, zapojení - Aktivace	39	23.3.2015	30.4.2015
- Kabeláž, zapojení - DN, Kalová jímka	39	23.3.2015	30.4.2015
- Kabeláž, zapojení - ČS, Hrubé před.	39	23.3.2015	30.4.2015
- Kabeláž, zapojení - Dmýchárna	39	23.3.2015	30.4.2015
- Individuální zkoušky	30	1.4.2015	30.4.2015
<b>Přepojování nové ČOV</b>	40	1.4.2015	10.5.2015
<b>Dokončení díla</b>			1.6.2015
<b>Zahájení přejímacího řízení</b>		10.5.2015	1.6.2015

#### - Mílník č. 1 termín do 19.12.2014

- SO 02.1 - zhotovení HOBAS komory, propojovacího potrubí KT DN 250 do nátokového žlabu
- SO 02.2 - kompletně stavebně dokončeno mimo technologické celky
- SO 02.3 - kompletně stavebně dokončeno mimo technologické celky
- SO 02.4 - kompletně stavebně dokončeno mimo technologické celky a zármkové dlažby
- SO 02.7 - stavebně dokončeno základy, HS po stropní kce z panelů SPIROLL
- SO 02.10 - kompletní hrubé násypy kolem objektů SO 02.2, SO 02.3 a SO 02.4
- SO 02.5 - kompletně dokončeno mimo technologické celky
- SO 02.6 - kompletně dokončeno
- SO 02.8 - kompletně dokončeno mimo kolize se stávajícím zařízením ČOV

#### - Mílník č. 2 termín do 15.4.2015

- SO 02.7 - kompletně dokončena sřešní kce, výplně otvorů, povrchové úpravy vnitřní a vnější, vnitřní instalace
- SO 03 - kompletně dokončeno
- SO 02.10 - kompletně stavebně dokončeno, zejména zahradní úpravy
- PS 01 - dokončeno
- PS 02 - dokončeno

#### - Mílník č. 3 termín do 10.5.2015

- kompletní uvedení nové ČOV do provozu, včetně provedení komplexních a individuálních zkoušek

#### - Mílník č. 4 termín do 1.6.2015

- dokončení a předání kompletního díla včetně dokladové složky

#### Poznámky:

Jelikož projektová dokumentace neřeší přepojení stávající ČOV na novou ČOV, bude toto přepojování řešeno v součinnosti s provozem ČOV a vedním společností VaK MB. Způsob tohoto přepojení bude oběma stranami odsouhlasen.

Po dobu vánočních svátků od 20.12.2015 do 5.1.2015 dojde k přerušení prací na ČOV.

Za předpokladu příznivých a vhodných klimatických podmínek pro montáže budou veškeré práce prováděny kontinuálně od 5.1.2015 s výjimkou technologických přestávek.

**FORTEX - AGS, a.s.**  
 ŠUMPERK, Jílová 1550/1, PSČ 787 92  
 IČ: 00150584 DIČ: CZ699000025  
 tel.: 583 310 111 www.fortex.cz
