HARMONOGRAM

Stavba : „Obnova ulice Tyršova, Dobrovice“ a „Dobrovice Tyršova, rekonstrukce vodovodu a kanalizace“

Objekt	Popis	
	Předání staveniště a přípravné práce	
SO 301.I	Rekonstrukce vodovodu I. etapa	132,55 m
SO 301.II	Rekonstrukce kanalizace I. etapa	214,41m
SO 303.II	Odvodnění komunikace I. etapa	
	MILNÍK č.1 - dokončení I. etapy - V + K + DK	
SO 301.II	Rekonstrukce vodovodu II. etapa	207,52m
SO 302.II	Rekonstrukce kanalizace II. etapa	196,57m
SO 303.I	Odvodnění komunikace II. etapa	
	MILNÍK č.3 - dokončení II. etapy - V + K + DK	
	ZIMNÍ TECHNOLOGICKÁ PŘESTÁVKA	
SO 102.I	Stavební úprava chodníku I. etapa	1.etapa - komunikace + vo
SO 103.I	Parkovací stání I. etapa	
SO 104.I	Místní komunikace MO2 10/5,5/30 I. etapa; RECYKLACE ZA STUDENA (předpoklad od 15/3/2025 s ohledem na nezbytné klimatické podmínky +5°C teplota zeminy) vč. pokládky ACo	
SO 105.I	Místa pro předcházení I. etapa	
SO 106.I	Stavební úprava sjezdu I. etapa	
SO 401.I	Veřejné osvětlení + rozhlas I. etapa	
SO 404.I	Chráničky pro optickou síť I. etapa	
SO 801.I	Sadové úpravy I. etapa	
	MILNÍK č.2 - kompletní dokončení I.etapy (210 dnů od převzetí staveniště)	
SO 101.II	Nový chodník II. etapa	2.etapa - komunikace + vo
SO 102.II	Stavební úprava chodníku II. etapa	
SO 103.II	Parkovací stání II. etapa	
SO 104.II	Místní komunikace MO2 10/5,5/30 II. etapa; RECYKLACE ZA STUDENA vč. pokládky ACo	
SO 105.II	Místa pro přecházení II. etapa	
SO 106.II	Sjezdy II. etapa	
SO 401.II	Veřejné osvětlení + rozhlas II. etapa	
SO 404.II	Chráničky pro optickou síť II. etapa	
SO 801.II	Sadové úpravy II. etapa	
VON I.+II.	Všeobecné a obecné náklady I. etapa + II. etapa	

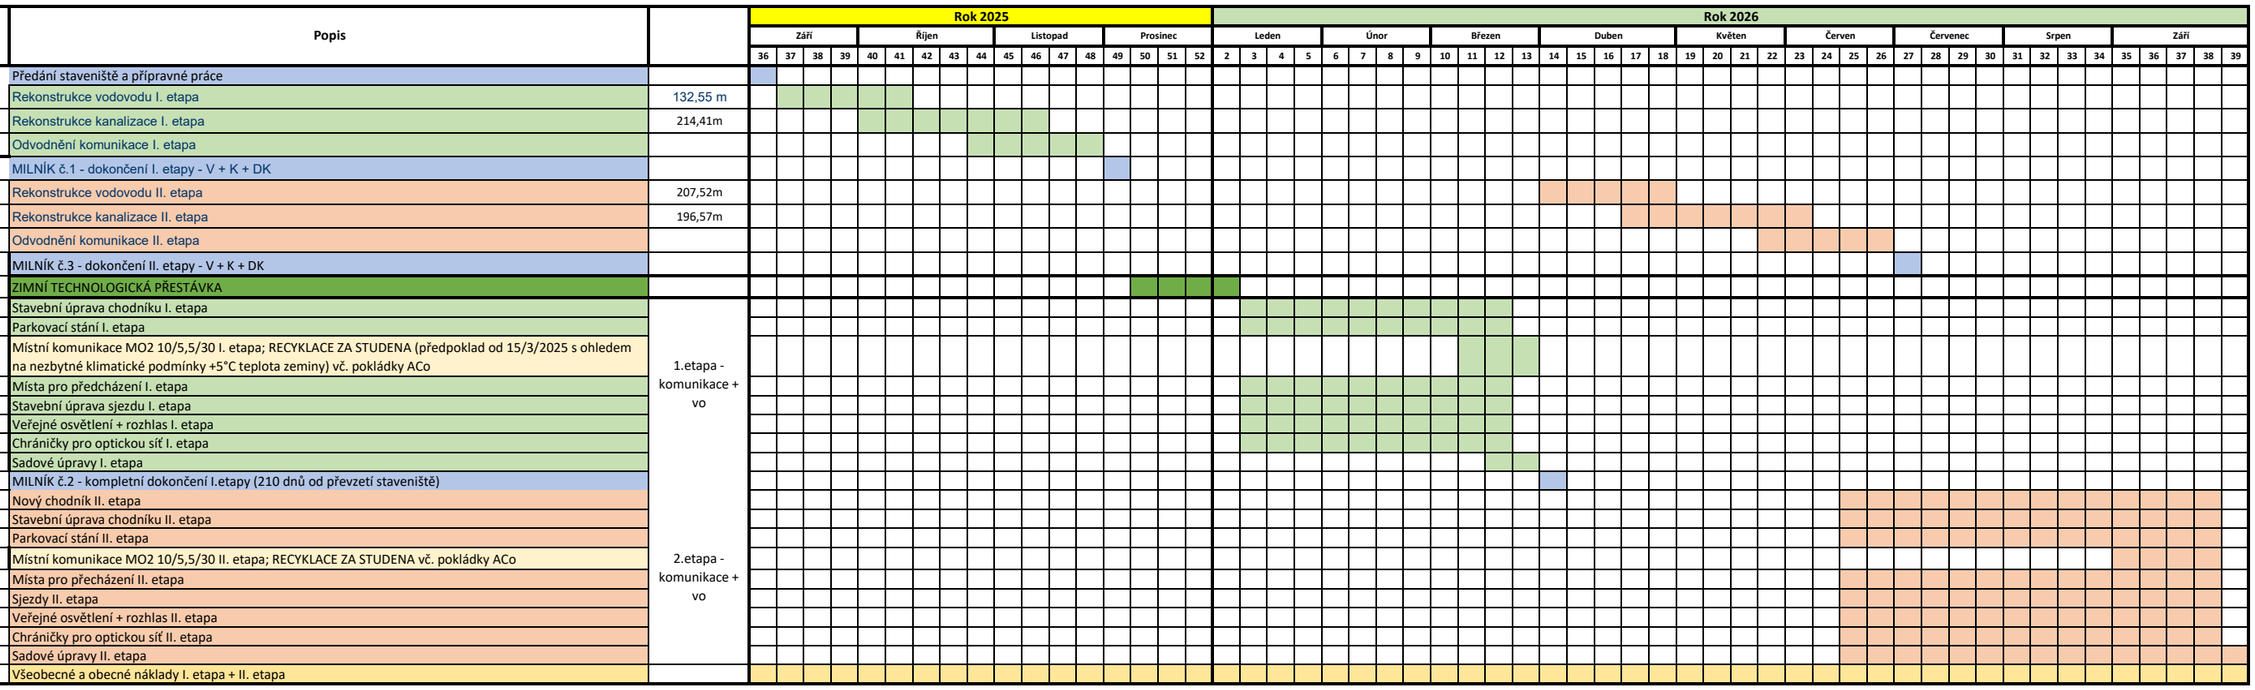

I.etapa
II. etapa
Milník dle SOD
